

MANUAL DO USUÁRIO

Sistema de Controle de Contratações

Fluxo de contratação do GT PROPAG – Compras Públicas: prazos legais, papéis e responsabilidades, atividades e acompanhamento da carteira da FAETEC.

ETAPA I

Planejamento
da
contratação

ETAPA II

Adesão à
ARP

ETAPA III

Comunicações
e análises

ETAPA IV

Pesquisa de
preços

ETAPA V

Formalização
e publicidade

Endereço de acesso: <https://gt-propag-faetec.netlify.app>

DOCUMENTO

Controle do documento

Título	Manual do Usuário — Sistema de Controle de Contratações do GT PROPAG
Grupo de trabalho	GT PROPAG – Compras Públicas (SEDES · SECTI · FAETEC · PRODERJ)
Endereço do sistema	https://gt-propag-faetec.netlify.app
Público	Integrantes do GT (15), coordenação, conformidade, pontos focais e administrador do sistema
Base normativa do fluxo	Lei nº 14.133/2021 · Decreto Estadual nº 48.816/2023 · Decreto nº 48.821/2023 (art. 2º) · Decreto nº 48.843/2023 · IN PRODERJ/PRE nº 05/2024 (art. 4º) · Enunciado 27 PGE-RJ
Classificação	Uso interno

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	24/09/2026	Versão inicial: implantação do sistema com as 17 demandas da planilha de andamento do GT.	Administração do sistema
1.1	24/09/2026	Inclusão da função “Alterar senha” (Capítulo 4.4).	Administração do sistema

SOBRE AS IMAGENS

As figuras são capturas reais do sistema. Alguns dados (datas de envio, andamentos e documentos) foram incluídos apenas para ilustrar as funcionalidades e podem não corresponder à situação atual das contratações. Os números em vermelho nas imagens correspondem às legendas logo abaixo de cada figura.

CONTEÚDO

Sumário

1	Apresentação	3
2	Conceitos do fluxo de contratação	4
3	Perfis de acesso e responsabilidades	7
4	Acesso ao sistema	9
5	Navegação e notificações	12
6	Painel de contratações	14
7	Carteira de contratações e planilha de andamento	17
8	Cadastrar uma nova contratação	19
9	Acompanhar uma contratação	23
	9.3 Registrar a data de envio e controlar o prazo legal	
10	Minhas pendências e pendências da equipe	30
11	Atas de registro de preços	32
12	Relatórios	34
13	Equipe do GT	36
14	Auditoria	38
15	Manutenção (administrador)	39
16	Rotina recomendada por perfil	44
17	Dúvidas frequentes	45
A	Anexo A — As 32 atividades do fluxo	46
B	Anexo B — Glossário	48

CAPÍTULO 1

Apresentação

O que é o sistema, para que serve e quem o utiliza.

O **Sistema de Controle de Contratações** automatiza o fluxo de contratações acompanhado pelo **GT PROPAG – Compras Públicas**, formado por 15 integrantes de quatro órgãos: SEDES, SECTI, FAETEC e PRODERJ. Ele substitui a planilha de andamento como fonte oficial de acompanhamento e reúne, em um só lugar:

- **O fluxo de contratação completo** — 3 macroprocessos, 5 etapas e 32 atividades, gerados automaticamente para cada demanda conforme a modalidade;
- **Os prazos legais** que não podem atrasar — Comunicação à SEPLAG (15 dias corridos), Análise técnica do PRODERJ (20 dias úteis, prorrogáveis por mais 20) e Análise da CGE (15 dias corridos), contados automaticamente a partir da data de envio;
- **Os papéis e responsabilidades** — quem responde por cada etapa e cada atividade, com perfis de acesso por função;
- **O acompanhamento** — painel geral, pendências por integrante, relatórios semanais e mensais, documentos anexados e trilha de auditoria de todas as alterações.

1.1 Como acessar

O sistema funciona pelo navegador (Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox atualizados), sem necessidade de instalação:

<https://gt-propag-faetec.netlify.app>

O acesso é restrito: somente integrantes cadastrados pelo administrador conseguem criar conta e entrar. O procedimento está no Capítulo 4.

1.2 Princípios de uso

- **O sistema é a fonte oficial.** Registre andamentos, datas e documentos no sistema, não em planilhas paralelas.
- **Sem data de envio, não há prazo.** A contagem dos prazos da SEPLAG, do PRODERJ e da CGE só começa quando a data de envio é registrada na atividade.
- **Toda ação é registrada.** Cada inclusão, alteração ou exclusão fica gravada na auditoria com autor, data, hora e os valores anteriores e novos.
- **Cada um vê o que precisa e altera o que lhe cabe.** As permissões seguem o papel de cada integrante no GT (Capítulo 3).

CAPÍTULO 2

Conceitos do fluxo de contratação

Etapas, modalidades, situações e cores usadas em todo o sistema.

2.1 Macroprocessos e etapas

O fluxo de contratação do GT está organizado em **3 macroprocessos** e **5 etapas**, que somam **32 atividades** (lista completa no Anexo A):

ETAPA I Planejamento da contratação 7 atividades FAETEC/DGI · GT · VPA ● PCA/PEDTIC a confirmar	ETAPA II Adesão à ARP 6 atividades GT · Div. Planejamento · DGI ● Gate: ata válida	ETAPA III Comunicações e análises 3 atividades FAETEC ● SEPLAG 15 corridos · PRODERJ 20 úteis (+20)	ETAPA IV Pesquisa de preços 7 atividades FAETEC (100%) ● Sem ponto focal nomeado	ETAPA V Formalização e publicidade 9 atividades FAETEC (100%) ● CGE 15 corridos
---	---	---	--	---

Macroprocesso	Etapas	Atividades	Base legal
1 · Fase preparatória — Planejamento da contratação	I	7	Decreto 48.816/2023 · IN PRODERJ/PRE 05/2024
2 · Seleção e precificação da solução	II, III, IV	16	Decretos 48.821/2023 e 48.843/2023 · IN PRODERJ/PRE 05/2024 · Enunciado 27 PGE-RJ
3 · Fase contratual — Formalização e publicidade do contrato	V	9	Decreto 48.821/2023 · Lei 14.133/2021 (PNCP)

2.2 Prazos legais monitorados

Atividade	Etapas	Prazo	Início da contagem	Base
Comunicação à SEPLAG	III	15 dias corridos	Data de envio registrada	Decreto 48.821/2023, art. 2º
Análise técnica do PRODERJ (TIC)	III	20 dias úteis (+20)	Data de envio registrada	IN PRODERJ/PRE 05/2024, art. 4º
Análise da CGE	V	15 dias corridos	Data de envio registrada	Decreto 48.821/2023

COMO O SISTEMA CONTA OS PRAZOS

Segue o art. 183 da Lei nº 14.133/2021: exclui o dia do envio, inclui o dia do vencimento e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Nos prazos em dias úteis, fins de semana e feriados cadastrados em Manutenção não são contados. Exemplo: envio à SEPLAG em 01/10/2026 vence em 16/10/2026; envio ao PRODERJ em 01/10/2026 vence em 03/11/2026 (12/10, 28/10 e 02/11 não contam).

2.3 Modalidades (enquadramento)

A modalidade define quais etapas entram no checklist da contratação. Ao trocar a modalidade, o sistema ajusta o checklist automaticamente.

Modalidade	Quando usar	Etapas geradas	Atividades
Adesão à ARP	Carona em ata de registro de preços de outro órgão	I, II, III, IV, V	32
Participante de RP	FAETEC participa da ata (ex.: PRODERJ) e usa o ETP do gerenciador — a atividade "Elaboração do ETP" já nasce concluída	I, III, IV, V	26
Dispensa	Art. 75 da Lei 14.133/2021	I, III, IV, V	26
Inexigibilidade	Art. 74 da Lei 14.133/2021	I, III, IV, V	26
Licitação própria	Fase externa ainda não mapeada no fluxo do GT	I, III, IV, V	26
A definir	Enquadramento ainda em aberto (ex.: sem ata compatível)	I	7

2.4 Situação da contratação

A situação resume o estado da demanda e aparece em todas as listas. Ela é escolhida em lista suspensa (as opções podem ser ajustadas pelo administrador):

Em instrução	Em andamento	Aguardando	Devolvida	Divergência	Sem justificativa	Suspensa
Concluída	Cancelada					

2.5 Status das atividades

Status	Significado
Pendente	Ainda não iniciada.
Em andamento	Em execução pelo responsável. O sistema registra a data de início.
Aguardando terceiros	Enviada a outro órgão ou área (SEPLAG, PRODERJ, CGE, área técnica) e aguardando retorno.

Status	Significado
Devolvida	Retornou com pendências. O responsável geral da contratação é notificado.
Concluída	Finalizada. O sistema registra a data de conclusão.
Não se aplica	Não é necessária nesta contratação.

2.6 Situação dos prazos

No prazo mais de 3 dias até o vencimento · Vence em breve 3 dias ou menos · Vencido prazo ultrapassado · Contagem não iniciada prazo legal sem data de envio · Cumprido / Cumprido com atraso para atividades concluídas.

CAPÍTULO 3

Perfis de acesso e responsabilidades

Cada integrante recebe um perfil de acesso de acordo com sua função no GT.

3.1 Composição do GT

Frente	Função no GT	Integrantes	Perfil de acesso
Frente I	Coordenação, aprovação e conformidade	Karina Ferrarez (SEDES), Vinicius Murat (FAETEC), Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI) · Elias Conceição Magalhães (SEDES)	Coordenação · Conformidade (Elias)
Frente II	Pesquisa e elaboração de artefatos	Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres, Pascoal (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)	Elaboração de artefatos
Frente III	Pontos focais e lançamento nos sistemas	Jhonatan Silva Santos, Gibson Cruz da Silva, Luene F. C. d'Ávila (FAETEC)	Ponto focal FAETEC

3.2 O que cada perfil pode fazer

Ação	Admin	Coordenação	Conformidade	Elaboração	Ponto focal	Consulta
Ver painel, contratações, pendências, relatórios e equipe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadastrar nova contratação	✓	✓	—	—	—	—
Editar dados e colunas do painel da contratação	✓	✓	✓	🔒 ¹	✓	—
Alterar a modalidade (regera o checklist)	✓	✓	—	—	—	—
Designar responsável geral e responsáveis por etapa	✓	✓	—	—	—	—
Atualizar atividades (status, responsável, datas)	✓	✓	✓	🔒 ²	🔒 ³	—
Registrar andamentos e anexar documentos	✓	✓	✓	✓	✓	—
Cadastrar e editar atas de registro de preços	✓	✓	✓	✓	✓	—
Ver a auditoria	✓	✓	✓	—	—	—

Ação	Admin	Coordenação	Conformidade	Elaboração	Ponto focal	Consulta
Excluir contratação ou ata	✓	—	—	—	—	—
Manutenção: integrantes, listas, prazos, feriados, modalidades	✓	—	—	—	—	—

¹ Somente nas contratações em que atua (responsável geral, responsável de etapa ou de alguma atividade). ² Atividades das Etapas I e II e as atribuídas a si. ³ Atividades das Etapas III a V e as atribuídas a si.

SEGURANÇA

As permissões são aplicadas diretamente no banco de dados. Mesmo que um botão apareça, a operação é recusada se o perfil não tiver permissão, com a mensagem “Seu perfil de acesso não permite esta operação”.

CAPÍTULO 4

Acesso ao sistema

Primeiro acesso, entrada, recuperação de senha e saída.

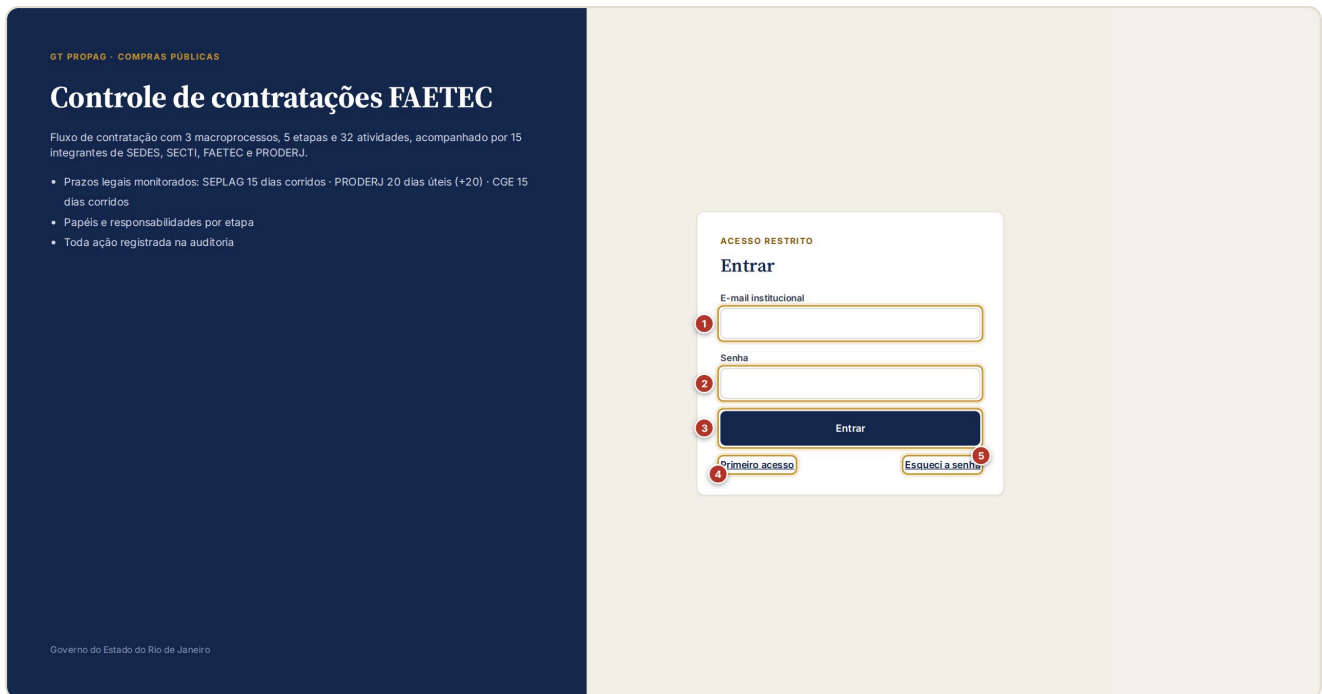


Figura 1 — Tela de acesso ao sistema.

- 1 E-mail institucional** — o mesmo cadastrado pelo administrador.
- 2 Senha** pessoal (mínimo de 8 caracteres).
- 3 Entrar** — acessa o sistema.
- 4 Primeiro acesso** — cria a sua senha na primeira vez.
- 5 Esqueci a senha** — envia um link de redefinição para o seu e-mail.


4.1 Primeiro acesso

ANTES DE COMEÇAR

O seu e-mail precisa estar cadastrado pelo administrador em **Manutenção > Integrantes**. E-mails não cadastrados recebem a mensagem "E-mail não cadastrado como integrante ativo do GT. Solicite acesso ao administrador."

- Abra <https://gt-propag-faetec.netlify.app> e clique em **Primeiro acesso**.
- Informe o **e-mail institucional**, crie uma **senha** (mínimo de 8 caracteres) e repita-a em **Confirme a senha**.

- 3 Clique em **Criar acesso**.
- 4 Abra o e-mail de confirmação enviado pelo sistema e clique no link.
- 5 Volte à tela de acesso e entre com e-mail e senha. A conta é vinculada automaticamente ao seu perfil no GT.

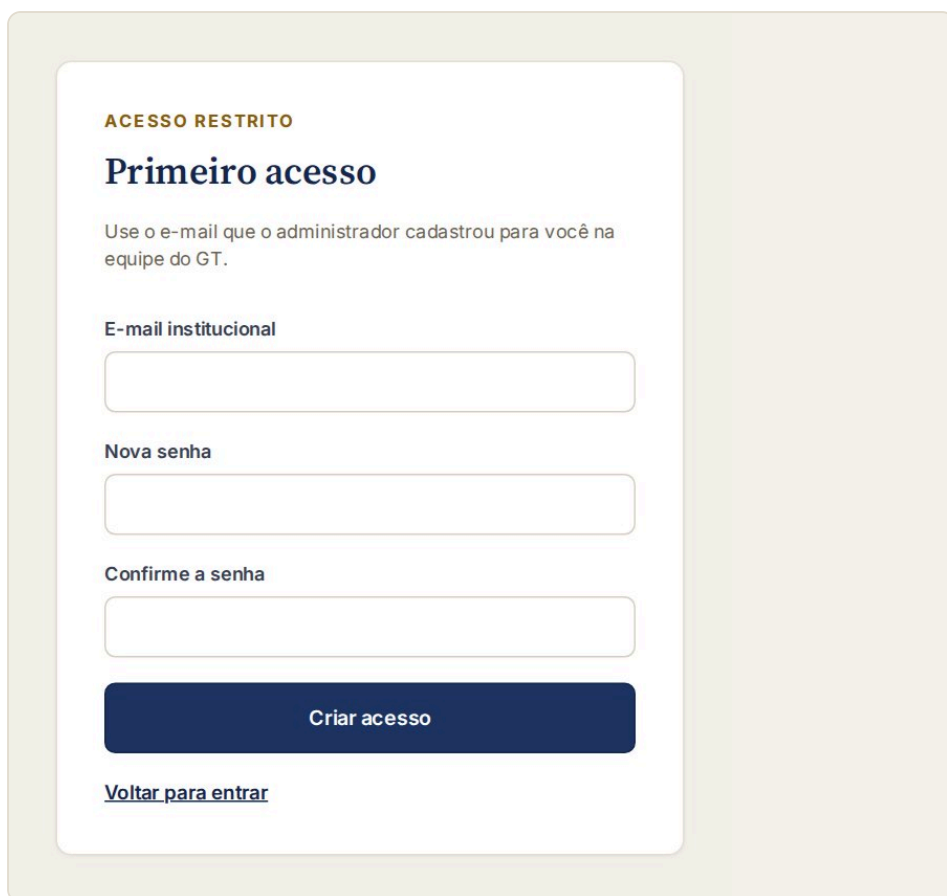

O formulário de primeiro acesso é exibido em uma tela com o título "ACESSO RESTRITO" e "Primeiro acesso". Abaixo do título, há uma instrução: "Use o e-mail que o administrador cadastrou para você na equipe do GT." O formulário contém três campos de entrada: "E-mail institucional", "Nova senha" e "Confirme a senha". Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Criar acesso". No rodapé do formulário, há um link azul com o texto "Voltar para entrar".

Figura 2 — Formulário de primeiro acesso.

ACESSO CRIADO PELO ADMINISTRADOR

Se o administrador já criou a sua conta e enviou uma senha provisória, não use "Primeiro acesso": entre diretamente com o e-mail e a senha recebidos e, em seguida, troque a senha em **Alterar senha** (Capítulo 4.4).

4.2 Entrar

- 1 Informe e-mail e senha e clique em **Entrar**.
- 2 O sistema abre o **Painel de contratações**. O seu nome e perfil aparecem no rodapé do menu lateral.

4.3 Esqueci a senha

- 1 Na tela de acesso, clique em **Esqueci a senha**, informe o e-mail e clique em **Enviar link**.

- 2 Abra o e-mail recebido e clique no link. O sistema abre a tela **Definir nova senha**.
- 3 Digite e confirme a nova senha e clique em **Salvar senha**.

4.4 Alterar a senha

- 1 No rodapé do menu lateral, clique em **Alterar senha**.
- 2 Digite a nova senha (mínimo de 8 caracteres), repita-a em **Confirme a nova senha** e clique em **Salvar nova senha**.
- 3 Use a nova senha a partir do próximo acesso.

SENHA PROVISÓRIA

Quem recebeu uma senha provisória do administrador deve trocá-la no primeiro acesso.

4.5 Sair

Clique em **Sair**, no rodapé do menu lateral. Em computadores compartilhados, sempre saia ao terminar.

CAPÍTULO 5

Navegação e notificações

Estrutura das telas, menu lateral e avisos do sininho.

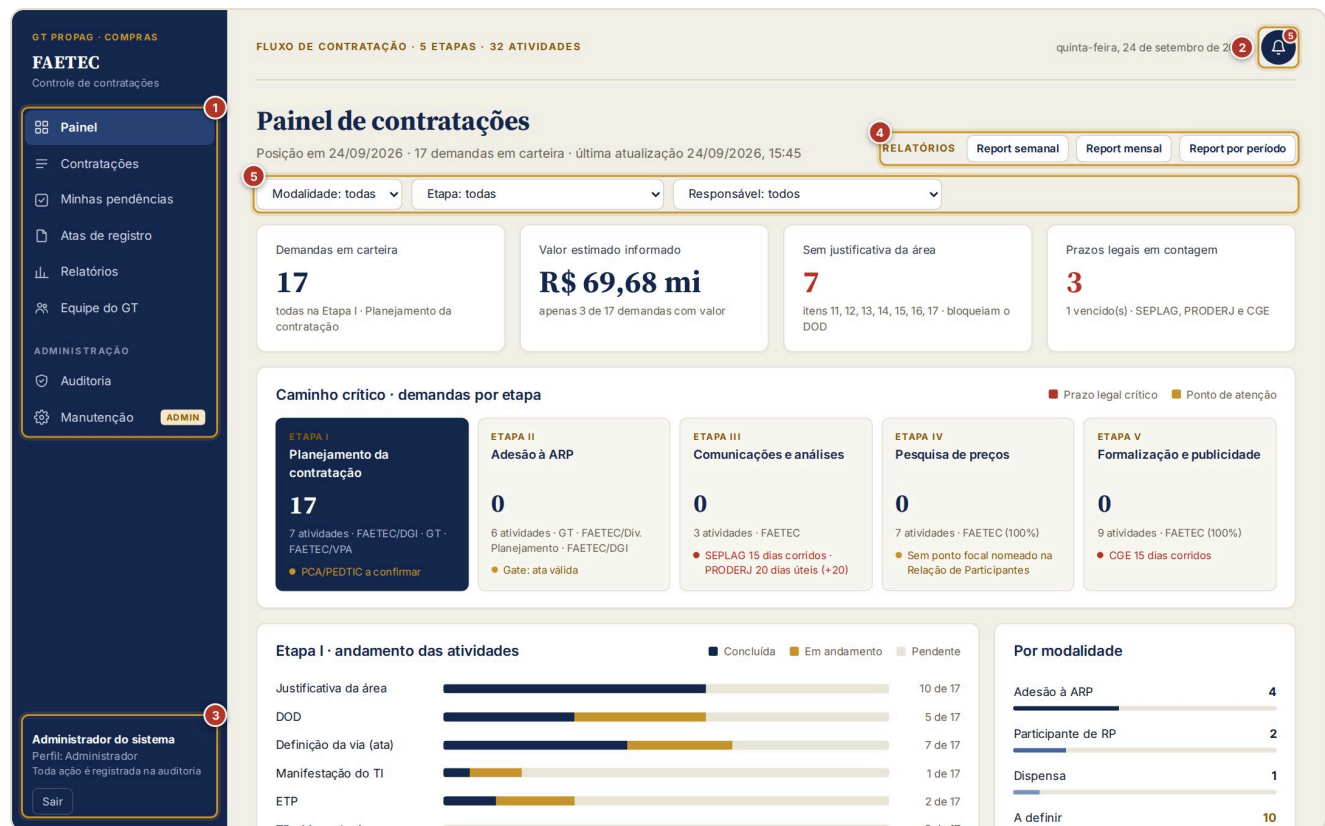


Figura 3 — Estrutura geral da tela.

- 1 **Menu lateral** — Painel, Contratações, Minhas pendências (com o total de atividades abertas), Atas de registro, Relatórios e Equipe do GT. Os itens **Auditoria** e **Manutenção** aparecem apenas para os perfis autorizados.
- 2 **Sininho** — notificações, com o número de avisos não lidos.
- 3 **Usuário** — nome, perfil de acesso e os botões **Alterar senha** e **Sair**.
- 4 **Atalhos de relatórios** — report semanal, mensal e por período.
- 5 **Filtros** da página.

5.1 Notificações

O sistema avisa automaticamente quando:

- você é designado **responsável por uma etapa** ou **por uma atividade**;
- alguém registra um **andamento** em uma contratação sob a sua coordenação (responsável geral);
- uma atividade de contratação sob a sua coordenação é **devolvida**.



Figura 4 — Painel de notificações.

- 1 Marcar todas como lidas.**
- 2** Clique em uma notificação para abrir a contratação correspondente. Os avisos não lidos aparecem com fundo destacado.

ATUALIZAÇÃO

As notificações são atualizadas a cada minuto e sempre que você muda de página.

CAPÍTULO 6

Painel de contratações

Visão geral de tudo o que está acontecendo na carteira do GT.

O Painel é a tela inicial. Use os filtros **Modalidade**, **Etap**a e **Responsável** no topo para recortar todos os indicadores de uma vez.



Figura 5 — Indicadores e caminho crítico.

- 1 **Demandas em carteira** — contratações ativas (exceto concluídas e canceladas) e a etapa em que se encontram.
- 2 **Valor estimado informado** — soma dos valores e quantas demandas já têm valor.
- 3 **Sem justificativa da área** — demandas que ainda bloqueiam a elaboração do DOD.
- 4 **Prazos legais em contagem** — atividades com data de envio registrada e quantos prazos já venceram.
- 5 **Caminho crítico** — quantidade de demandas em cada etapa, com os prazos críticos (vermelho) e os pontos de atenção (dourado). Clique em uma etapa para ver a lista filtrada.

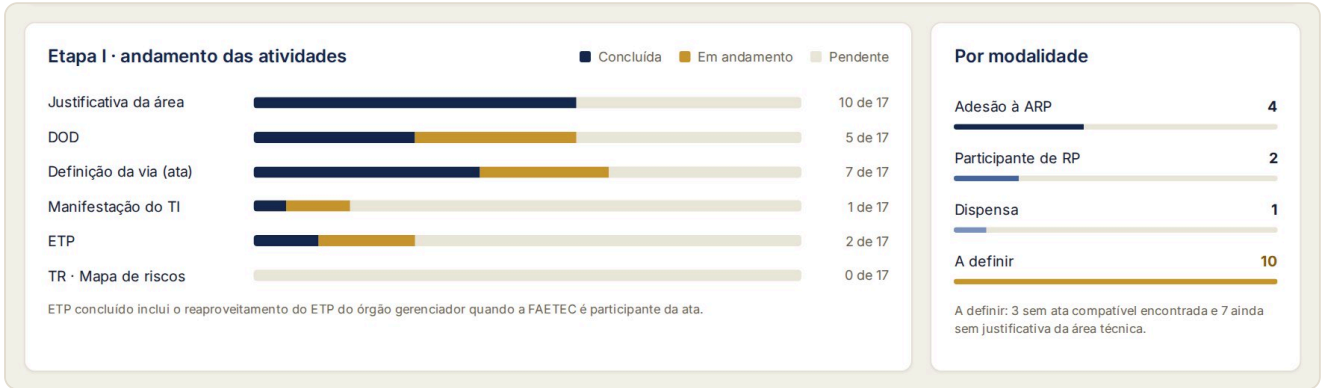


Figura 6 — Andamento da Etapa I e distribuição por modalidade.

Etapa I - andamento das atividades mostra, para toda a carteira, quantas demandas já concluíram (azul) ou estão executando (dourado) cada artefato do planejamento: justificativa, DOD, definição da via, manifestação do TI, ETP e TR/Mapa de riscos. **Por modalidade** mostra o enquadramento da carteira.



Figura 7 — Prazos legais e prazos vencidos.

A tabela de prazos (1) lista primeiro os vencidos e depois os prazos legais em contagem, com dias restantes e situação. Clique em uma linha para abrir a contratação. À direita, o quadro lembra os três prazos legais monitorados e a regra de contagem.



Figura 8 — Contratações que pedem ação, pendências por responsável e qualidade do registro.

- **Contratações que pedem ação** — prioriza prazos vencidos, divergências e devoluções, depois demandas em andamento ou aguardando, pelo valor.
- **Pendências por responsável** — quem está com a atividade atual de cada contratação e quantas estão **sem responsável definido**.

- **Qualidade do registro** — lacunas que impedem o controle: sem datas de andamento, sem processo SEI, sem valor, sem responsável geral e divergências a validar.

CAPÍTULO 7

Carteira de contratações e planilha de andamento

Localizar demandas, filtrar, editar em lote e exportar para Excel.

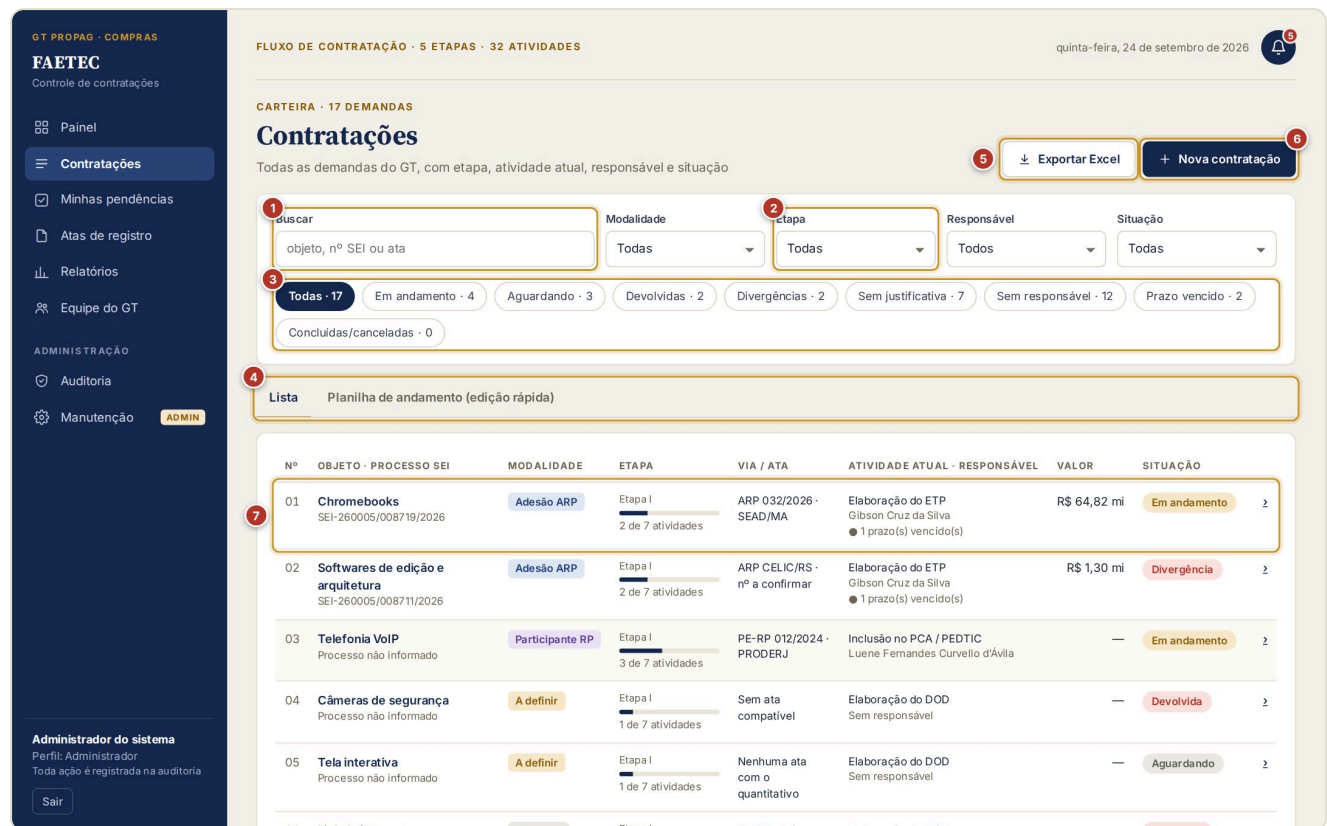


Figura 9 — Lista de contratações.

- 1 **Buscar** por objeto, número SEI, número da ata ou número de controle.
- 2 **Filtros** por modalidade, etapa, responsável e situação.
- 3 **Atalhos** com contagem: em andamento, aguardando, devolvidas, divergências, sem justificativa, sem responsável, prazo vencido e concluídas/canceladas.
- 4 **Visões:** Lista ou Planilha de andamento (edição rápida).
- 5 **Exportar Excel** — gera a planilha com todas as colunas do painel, respeitando os filtros aplicados.
- 6 **Nova contratação** (Coordenação e Administrador).
- 7 Cada linha mostra modalidade, progresso na etapa atual, via/ata, atividade atual com responsável, valor e situação. Clique na linha para abrir a contratação.

7.1 Planilha de andamento (edição rápida)

A visão **Planilha de andamento** reproduz as colunas da planilha do GT (processo antigo e novo, modalidade, DOD, ata de registro de preços, manifestação do TI, documentos da fase preparatória, valor global, último andamento, observação e situação), com **listas suspensas** nos campos padronizados.

Edição direta das colunas da planilha de andamento do GT. Cada alteração é salva ao sair do campo e registrada na auditoria.

Nº · OBJETO	PROCESSO ANTIGO	PROCESSO NOVO (SEI)	MODALIDADE	STATUS	DOD	STATUS
01 · Chromebooks	SEI-260005/007702/2026	SEI-260005/008719/2026	Adesão à ARP	Elaborado	Pretende-se atender à demanda por meio de adesão à ARP nº	SIM
02 · Softwares de edição e arquitetura	SEI-260005/007249/2026	SEI-260005/008711/2026	Adesão à ARP	Elaborado	Pretende-se utilizar a ARP nº 147/2024 – CELIC/RS.	SIM
03 · Telefonia VoIP			Participante de RF	Elaborado	Pretende-se participar da futura contratação vinculada ao Registro	PARTIC
04 · Câmeras de segurança			A definir	Em Elaboraça	Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de	NÃO
05 · Tela interativa			A definir	Em Elaboraça	Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de	NÃO
06 · Link de internet			Dispensa	Em Elaboraça	Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de	NÃO
07 · Licenças Microsoft			Participante de RF	Elaborado	Pretende-se atender à demanda mediante participação no PERP	PARTIC
08 · Antivirus com EDR			Adesão à ARP	Em Elaboraça	Pretende-se atender à demanda por adesão - ARP 02/2026 TJMA	SIM

Figura 10 — Planilha de andamento editável.

- 1 **Status** em lista suspensa (ex.: DOD Elaborado, Em Elaboração, Em Análise).
- 2 **Observação** em texto livre.
- 3 **Modalidade** — só Coordenação e Administrador alteram. A troca ajusta o checklist.

SALVAMENTO AUTOMÁTICO

Cada campo é salvo ao sair dele (tecla Tab ou clique fora). A célula fica amarela enquanto salva e verde quando conclui. Cada alteração é registrada na auditoria.

CAPÍTULO 8

Cadastrar uma nova contratação

Perfis Coordenação e Administrador. O cadastro gera o checklist, os prazos e avisa os responsáveis.

- 1 Em **Contratações**, clique em **+ Nova contratação**.
- 2 Preencha os cinco blocos: Identificação, Planejamento e PCA, Enquadramento, Responsáveis e Documentos.
- 3 Confira o resumo à direita e clique em **Criar contratação**.

A imagem mostra a interface do sistema de contratação do FAETEC. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o perfil do usuário. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Painel', 'Contratações', 'Minhas pendências', 'Atas de registro', 'Relatórios', 'Equipe do GT' e 'ADMINISTRAÇÃO'. O formulário principal é dividido em cinco abas: 1. Identificação, 2. Planejamento e PCA, 3. Enquadramento, 4. Responsáveis e 5. Documentos. A aba 1 está selecionada e contém campos para: Nº de controle (18), Objeto (Contratação de notebooks para os laboratórios, visando atender às necessidades da FAETEC), Nome curto (painel) (Notebooks para os laboratórios), Categoria (Bem, Serviço, Ambos), Área demandante (Administração), Solução de TIC? (Sim, Não), Processo SEI de origem (SEI-260005/000000/2026), Processo SEI da contratação (Pode ser informado depois) e Justificativa da área técnica recebida? (Sim, anexar, Ainda não). À direita, há um resumo do checklist com 32 atividades, uma barra de progresso e uma lista de prazos legais a serem monitorados. No canto inferior esquerdo, há uma seção para o administrador do sistema.

GT PROPAG · COMPRAS
FAETEC
Controle de contratações

Contratações / Nova contratação
CADASTRO DA DEMANDA · GERA O CHECKLIST DO FLUXO

Nova contratação

Preencha a identificação e o enquadramento. O sistema cria as atividades, os prazos legais e avisa os responsáveis.

Cancelar Salvar rascunho

1 Identificação 2 Planejamento e PCA 3 Enquadramento 4 Responsáveis 5 Documentos

1 · Identificação da demanda * obrigatório

Nº de controle 18 Objeto * Contratação de notebooks para os laboratórios, visando atender às necessidades da FAETEC

Nome curto (painel) Notebooks para os laboratórios Como a demanda aparece nas listas. Ex.: Chromebooks

Categoria * Bem Serviço Ambos

Área demandante * Administração Solução de TIC? * Sim Não

Processo SEI de origem SEI-260005/000000/2026 Processo SEI da contratação Pode ser informado depois

Justificativa da área técnica recebida? * Sim, anexar Ainda não

2 · Planejamento e PCA

Consta no PCA / PEDTIC? * Sim Não Item do PCA / PEDTIC Nº do item ID SIGA do item Ou marque: não cadastrado

Valor estimado (R\$) 850000 Origem da estimativa Ata, pesquisa prévia, histórico Data-meta da contratação dd/mm/yyyy

AO CRIAR, O SISTEMA GERA
32 atividades no checklist
Modalidade: Adesão à ARP

I	Planejamento da contratação	7
II	Adesão à ARP	6
III	Comunicações e análises	3
IV	Pesquisa de preços	7
V	Formalização e publicidade	9

Fluxo completo das 5 etapas, conforme o caminho crítico do GT.

Prazos legais que serão monitorados

Comunicação à SEPLAG	15 dias corridos
Análise técnica do PRODERJ (TIC)	20 dias úteis (+20)
Análise da CGE	15 dias corridos

A contagem começa quando a data de envio for registrada na atividade.

Também acontece

Figura 11 — Nova contratação — identificação e resumo.

- 1 **Passos** — clique para ir direto a cada bloco.
- 2 **Objeto** (obrigatório), no padrão “Contratação de [objeto], visando atender às necessidades da FAETEC”.
- 3 **Nome curto** — como a demanda aparece nas listas (ex.: “Chromebooks”). É sugerido a partir do objeto.
- 4 **Justificativa da área técnica recebida?** (obrigatório). Se “Ainda não”, a demanda entra como **Sem justificativa**.
- 5 **Resumo** — quantas atividades serão geradas por etapa na modalidade escolhida e quais prazos legais serão monitorados.
- 6 **Criar contratação.** Abaixo do botão, o sistema lista os campos obrigatórios que faltam.

No bloco **Planejamento e PCA**, informe se a demanda consta no PCA/PEDTIC (obrigatório), o item, o ID SIGA, o valor estimado, a origem da estimativa e a data-meta.

Figura 12 — Enquadramento e ata de registro de preços.

- 1 **Modalidade** — define as etapas do checklist (Capítulo 2.3).
- 2 **Ata de registro de preços** — busque no catálogo ou clique em **Cadastrar nova ata**. Se nenhuma ata servir, marque “Nenhuma ata compatível encontrada”.

4 - Responsáveis

1 Responsável geral (Coordenação) *
 Vinicius Murat - FAETEC

Prioridade
 Alta Média Baixa

2

ETAPA	PERFIL QUE EXECUTA	RESPONSÁVEL
I	Planejamento da contratação Elaboração de artefatos - Frente II	Selecione um integrante
II	Adesão à ARP Elaboração de artefatos - Frente II	Selecione um integrante
III	Comunicações e análises Ponto focal FAETEC - Frente III	Gibson Cruz da Silva - FAETEC
IV	Pesquisa de preços Ponto focal FAETEC	Selecione um integrante
V	Formalização e publicidade Ponto focal FAETEC	Selecione um integrante

Etapa sem ponto focal nomeado no GT

Etapa sem ponto focal nomeado no GT

Figura 13 — Responsáveis.

- 1 **Responsável geral** (Coordenação, obrigatório) e **prioridade**.
- 2 **Responsável por etapa** — será atribuído a todas as atividades da etapa e receberá um aviso. As Etapas IV e V aparecem em vermelho enquanto não houver ponto focal designado.

5 - Documentos iniciais

1

↑

Arraste arquivos ou clique para anexar
 PDF, DOCX ou XLSX - até 50 MB por arquivo

2

Link da pasta no Drive ou documento SEI
 https://

Observação inicial
 Vira o primeiro andamento da linha do tempo

Figura 14 — Documentos iniciais.

- 1 **Anexos** — arraste ou clique para anexar PDF, Word ou Excel (até 50 MB cada) e escolha o tipo de cada documento.
- 2 **Link da pasta** (Drive ou SEI) e **observação inicial**, que vira o primeiro andamento da linha do tempo.

AO CRIAR, O SISTEMA

- atribui o próximo número de controle;
- gera as atividades do checklist conforme a modalidade;
- atribui os responsáveis por etapa e envia os avisos;
- registra a criação na auditoria;
- inclui a demanda no painel e nos relatórios.

SALVAR RASCUNHO

Use **Salvar rascunho** (exige apenas o objeto) para completar o cadastro depois. Rascunhos aparecem na lista com o selo "Rascunho" e não entram nos indicadores do painel.

CAPÍTULO 9

Acompanhar uma contratação

Checklist das atividades, prazos legais, responsáveis, andamentos, documentos e histórico.

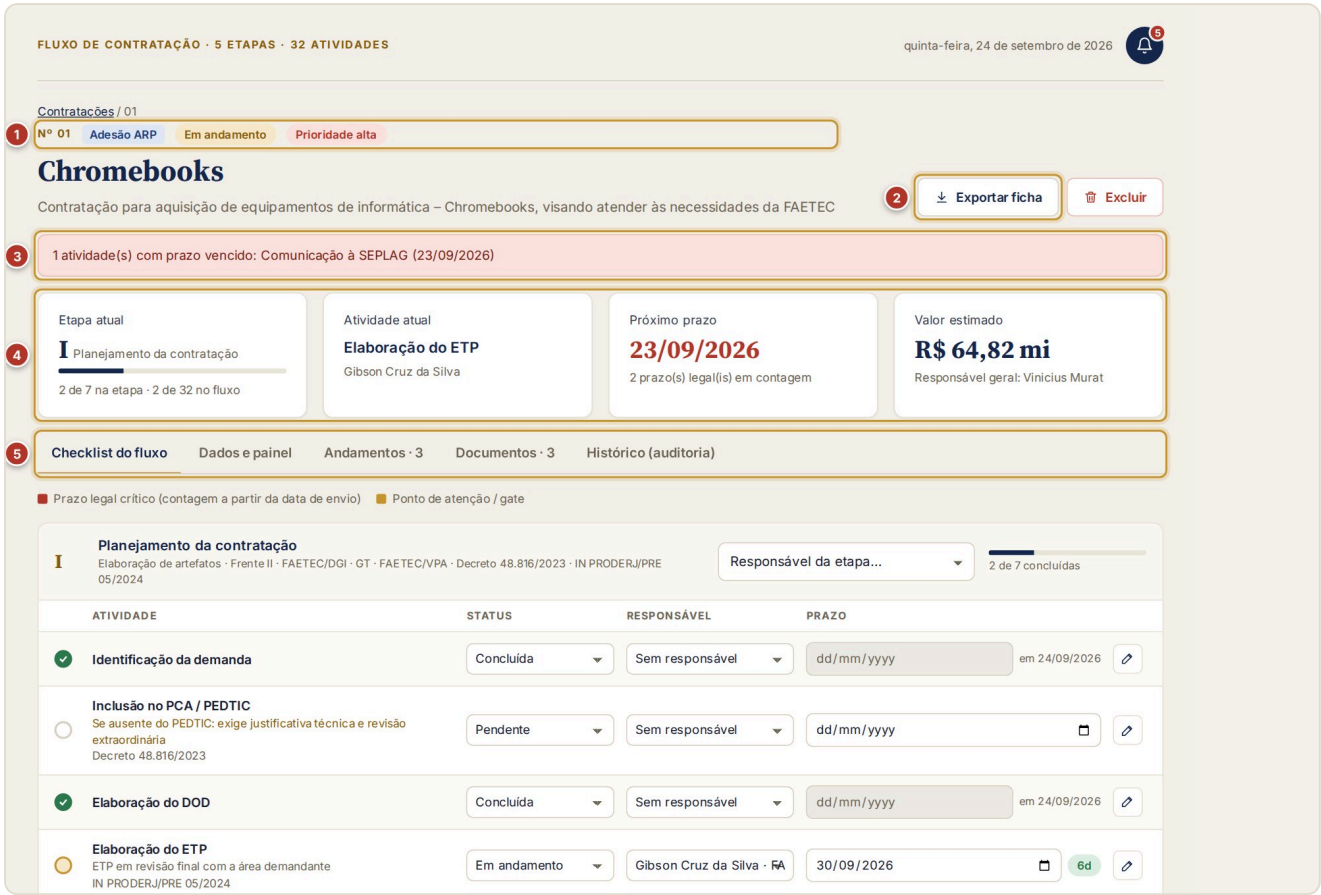


Figura 15 — Página da contratação.

- 1 **Identificação** — número, modalidade, situação e prioridade.
- 2 **Exportar ficha** — Excel com o checklist e os andamentos. **Excluir** aparece só para o Administrador.
- 3 **Alertas** — prazos vencidos, divergência a validar e falta de justificativa.
- 4 **Resumo** — etapa atual e progresso, atividade atual e responsável, próximo prazo e valor estimado.
- 5 **Abas** — Checklist do fluxo, Dados e painel, Andamentos, Documentos e Histórico (auditoria).

9.1 Checklist do fluxo

As atividades aparecem agrupadas por etapa. Clique no cabeçalho de uma etapa para recolher ou expandir.

Prazo legal crítico (contagem a partir da data de envio)

Ponto de atenção / gate

I

Planejamento da contratação

Elaboração de artefatos · Frente II · FAETEC/DGI · GT · FAETEC/VPA · Decreto 48.816/2023 · IN PRODERJ/PRE 05/2024

Responsável da etapa...

2 de 7 concluídas

ATIVIDADE	STATUS	RESPONSÁVEL	PRAZO
✓ Identificação da demanda	Concluída	Sem responsável	dd/mm/yyyy em 24/09/2026
○ Inclusão no PCA / PEDTIC Se ausente do PEDTIC: exige justificativa técnica e revisão extraordinária Decreto 48.816/2023	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy
✓ Elaboração do DOD	Concluída	Sem responsável	dd/mm/yyyy em 24/09/2026
○ Elaboração do ETP ETP em revisão final com a área demandante IN PRODERJ/PRE 05/2024	Em andamento	Gibson Cruz da Silva · FA	30/09/2026 6d
○ Elaboração do TR	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy
○ Mapa de Riscos	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy
○ Aprovação e autorização (VPA)	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy

Figura 16 — Etapa I no checklist.

- 1

Progresso da etapa — atividades concluídas sobre o total.
- 2

Prazo interno — para atividades sem prazo legal, informe uma data-meta. O sistema mostra os dias restantes e passa a cobrar o prazo nas pendências e no painel.

9.2 Atualizar uma atividade

- 1

No checklist, altere o **Status** na lista suspensa. O sistema registra automaticamente a data de início (Em andamento/Aguardando) ou de conclusão (Concluída) e cria um registro na linha do tempo.
- 2

Altere o **Responsável**, se necessário. O novo responsável recebe um aviso.
- 3

Para registrar observações, datas ou anexos da atividade, clique no **lápiz** ao final da linha.

9.3 Registrar a data de envio e controlar o prazo legal

Este é o procedimento mais importante do sistema. Os prazos da SEPLAG, do PRODERJ e da CGE só são controlados depois que a data de envio é registrada.

Figura 17 — Etapa III com prazos legais em contagem.

- 1 Responsável da etapa** (Coordenação/Administrador) — atribui o integrante a todas as atividades abertas da etapa.
- 2 Status** — ao enviar ao órgão, use **Aguardando terceiros**.
- 3 Responsável** pela atividade.
- 4 Envio** — informe a data em que o processo foi enviado. O sistema calcula o **vencimento** e mostra os dias restantes. A caixa fica verde (no prazo), dourada (vence em até 3 dias) ou vermelha (vencido).
- 5 Prorrogado (+20)** — no PRODERJ, marque quando houver prorrogação. O vencimento passa a considerar 40 dias úteis.
- 6 Lápis** — observações e anexos da atividade (por exemplo, o ofício ou o e-mail de envio).

- 1** Abra a contratação e localize a atividade (*Comunicação à SEPLAG*, *Análise técnica do PRODERJ (TIC)* ou *Análise da CGE*).
- 2** No campo **Envio**, informe a data de envio. O vencimento aparece imediatamente.
- 3** Mude o status para **Aguardando terceiros**.
- 4** Anexe o comprovante de envio pelo lápis ou pela aba Documentos.
- 5** Quando o órgão responder, mude o status para **Concluída**. O sistema registra se o prazo foi cumprido ou cumprido com atraso.

ATENÇÃO

Registre a data de envio no mesmo dia em que o processo for enviado. Sem ela, a atividade fica como "Contagem não iniciada" e o prazo não aparece nos alertas, nas pendências nem nos relatórios.

9.4 Detalhes da atividade

Elaboração do ETP

Etapa I · Planejamento da contratação **Em andamento**

Base legal: IN PRODERJ/PRE 05/2024

Início: 24/09/2026 Prazo interno (meta): 30/09/2026

Observação / pendência: ETP em revisão final com a área demandante

Anexos da atividade

Anexar à atividade
PDF, DOCX ou XLSX · até 50 MB por arquivo

Fechar Salvar

Figura 18 — Janela de detalhes da atividade (lápiz).

Na janela de detalhes você registra a data de início, o prazo interno, a data de conclusão (quando concluída) e a observação ou pendência (o que falta, com quem está, próximo passo), e anexa documentos à atividade. A base legal e os pontos de atenção da atividade aparecem no topo.

9.5 Dados e painel

Situação e responsabilidade

Situação: Em andamento Prioridade: Alta Média Baixa Responsável geral (Coordenação): Vinicius Murat · FAETEC

Divergência a validar

Rascunho: Publicado Rascunho

Figura 19 — Aba Dados e painel — situação e responsabilidade.

A aba reúne todos os dados cadastrais: situação, prioridade, responsável geral, divergência a validar, identificação, PCA, valor, modalidade, ata e as **colunas do painel** da planilha do GT.

Painel de andamento (colunas da planilha do GT)

DOD · status Elaborado	DOD · observação Pretende-se atender à demanda por meio de adesão à ARP nº 032/2026 – SEAD/MA (Governo do Maranhão).
Ata de registro · status SIM	Ata de registro · observação Ata de Registro de Preços do Governo do Maranhão – SEAD /032/2026
Manifestação do TI · status EM ANÁLISE	Manifestação do TI · situação Em análise - Gibson
Fase preparatória · status Elaboração do ETP	Fase preparatória · observação Não consta ID SIGA cadastrado para esta especificação
Observação Foi verificado junto à empresa que há a viabilidade de adesão, porém, necessita da análise pela área demandante das questões técnicas e operacionais como entrega, etc.	
Link da pasta (Drive / SEI) https://	

Figura 20 — Colunas do painel de andamento com listas suspensas.

- 1 Altere os campos desejados. O rodapé mostra quantos campos foram alterados.
- 2 Clique em **Salvar alterações** ou em **Descartar**.

TROCA DE MODALIDADE

Ao salvar uma nova modalidade, o checklist é ajustado: etapas novas são criadas, e atividades de etapas que deixaram de se aplicar são removidas (se nunca foram tocadas) ou marcadas como “Não se aplica”.

9.6 Andamentos

Linha do tempo

☒ Mostrar registros automáticos

- 24/09/2026, 15:45 · Gibson Cruz da Silva · Andamento
Manifestação técnica do TI em elaboração. Previsão de conclusão até 30/09.
- 24/09/2026, 15:45 · Gibson Cruz da Silva · Sistema · Análise técnica do PRODERJ (TIC)
Análise técnica do PRODERJ (TIC): Pendente → Aguardando terceiros
- 24/09/2026, 15:45 · Gibson Cruz da Silva · Envio · Análise técnica do PRODERJ (TIC)
Análise técnica do PRODERJ (TIC): envio em 15/09/2026 · prazo legal até 14/10/2026
- 24/09/2026, 15:45 · Gibson Cruz da Silva · Sistema · Comunicação à SEPLAG
Comunicação à SEPLAG: Pendente → Aguardando terceiros
- 24/09/2026, 15:45 · Gibson Cruz da Silva · Envio · Comunicação à SEPLAG
Comunicação à SEPLAG: envio em 08/09/2026 · prazo legal até 23/09/2026
- 24/09/2026, 15:44 · Sistema · Sistema
Demanda importada da PLANILHA ANDAMENTO GT (carga inicial).

Registrar andamento

Tipo
Andamento

Atividade relacionada (opcional)
—

Descrição
O que aconteceu, com quem está, próximo passo

Registrar

O texto passa a ser o “último andamento” no painel e avisa o responsável geral.

Figura 21 — Linha do tempo e registro de andamento.

- 1 **Linha do tempo** — andamentos registrados pela equipe e registros automáticos (mudanças de status e envios). Desmarque “Mostrar registros automáticos” para ver só os andamentos manuais.
- 2 **Registrar andamento** — escolha o tipo (andamento, envio/tramitação, devolução ou divergência), a atividade relacionada (opcional) e descreva o que aconteceu, com quem está e o próximo passo.

O andamento registrado passa a ser o **último andamento** da contratação no painel e na planilha, e o responsável geral é notificado.

9.7 Documentos

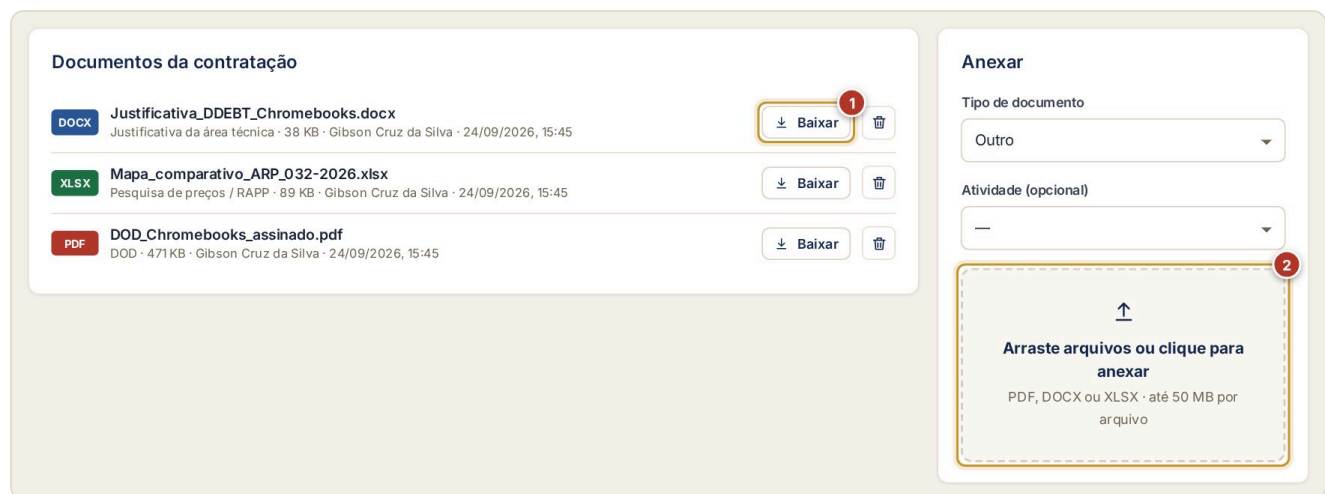


Figura 22 — Documentos da contratação.

- 1 **Baixar** — o arquivo é aberto por um link temporário e seguro.
- 2 **Anexar** — escolha o tipo de documento e, se quiser, a atividade relacionada. Arraste os arquivos ou clique na área. Formatos aceitos: PDF, DOC, DOCX, XLS e XLSX, com até 50 MB por arquivo.

Quem enviou o documento, a Coordenação e o Administrador podem removê-lo (lixeira). A remoção fica registrada na auditoria.

9.8 Histórico (auditoria da contratação)

QUANDO	QUEM	OPERAÇÃO	O QUE	CAMPOS	
24/09/2026, 15:45	Luene Fernandes Curvello d'Ávila	Inclusão	Documento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Luene Fernandes Curvello d'Ávila	Inclusão	Documento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Luene Fernandes Curvello d'Ávila	Inclusão	Documento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Alteração	Contratação	ultimo_andamento, ultimo_andamento_em	Ocultar
CAMPO		ANTES	DEPOIS		
Último andamento		Análise técnica do PRODERJ (TIC): envio em 15/09/2026 - prazo legal até 14/10/2026	Manifestação técnica do TI em elaboração. Previsão de conclusão até 30/09.		
Data do último andamento		24/09/2026, 15:45:03	24/09/2026, 15:45:03		
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Andamento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Alteração	Atividade · Elaboração do ETP	observacao, prazo_meta	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Andamento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Alteração	Atividade · Análise técnica do PRODERJ (TIC)	data_envio, data_inicio, prazo_legal, status	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Andamento	—	Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Contratação	ultimo_andamento	Detalhes

Figura 23 — Histórico de alterações da contratação.

Disponível para Administrador, Coordenação e Conformidade. Mostra todas as alterações da contratação e de suas atividades, andamentos, responsáveis e documentos. Clique em **Detalhes** para ver o valor anterior e o novo de cada campo.

9.9 Encerrar ou excluir

Para encerrar uma demanda, altere a situação para **Concluída** ou **Cancelada**. A exclusão (Administrador) apaga o checklist, os andamentos e os documentos, e deve ser usada apenas para registros criados por engano. Os dados excluídos permanecem na auditoria.

CAPÍTULO 10

Minhas pendências e pendências da equipe

Tudo o que está com cada integrante: atividades, prazos, status e pendências.



Figura 24 — Minhas pendências (exemplo de um ponto focal).

- 1 Indicadores** — atividades abertas, prazos vencidos, vencimentos em até 5 dias, aguardando terceiros e contratações sob a sua coordenação.
- 2 Filtros** — abertas, vencidas, próximos 5 dias, concluídas e todas. A lista é ordenada pelo prazo mais próximo.
- 3 Status** — atualize a atividade diretamente na lista.
- 4 Contratações sob coordenação** — demandas em que você é o responsável geral.

Use a lista suspensa no topo para ver as pendências de outro integrante e **Exportar** para gerar a lista em Excel.

10.1 Visão da equipe

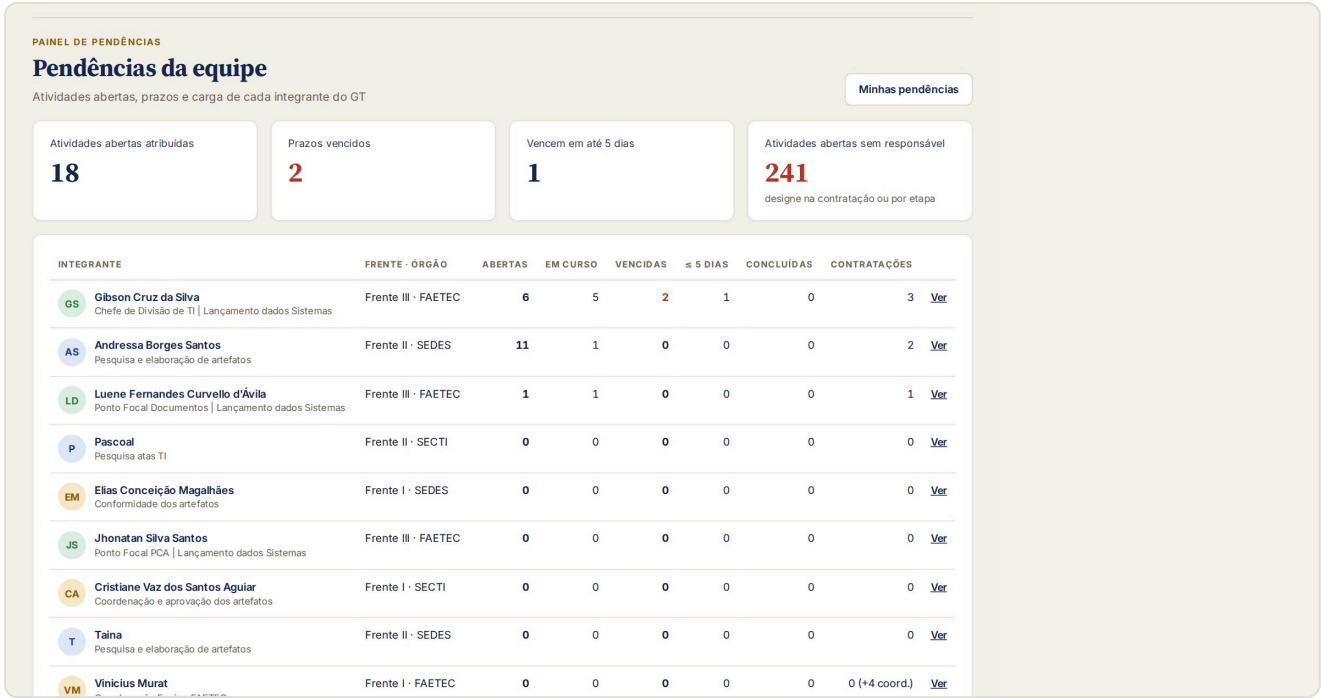


Figura 25 — Pendências da equipe.

Clique em **Visão da equipe** para ver a carga de todos os integrantes: abertas, em curso, vencidas, a vencer em até 5 dias, concluídas e contratações envolvidas. O indicador **Atividades abertas sem responsável** mostra o que ainda precisa ser designado. Clique em um integrante para abrir as pendências dele.

CAPÍTULO 11

Atas de registro de preços

Catálogo das atas pesquisadas pelo GT para adesão ou participação.

CATÁLOGO - 6 ATAS

Atas de registro de preços

Atas pesquisadas pelo GT para adesão (carona) ou participação. Gate da Etapa II: sem ata válida, o fluxo de ARP é interrompido.

1

+ Cadastrar ata

2

Buscar por número, órgão gerenciador, objeto ou fornecedor

ATA	OBJETO - FORNECEDOR	USO	VIGÊNCIA	CONTRATAÇÕES	
ARP 02/2026 TJMA	Licenças de antivírus com tecnologia EDR	Adesão	Vigência não informada Vigente	08 - Antivirus com EDR	Editar Excluir
ARP 032/2026 SEAD/MA (Governo do Maranhão)	Equipamentos de informática – Chromebooks	Adesão	Vigência não informada Vigente	01 - Chromebooks	Editar Excluir
ARP 147/2024 CELIC/RS	Licenciamento de softwares de edição e arquitetura Divergência: DOD cita ARP 147/2024 e a planilha cita ARP 1477/2024. Validar o número.	Adesão	Vigência não informada Vigente	02 - Softwares de edição e arquitetura	Editar Excluir
PE-RP 012/2024 PRODERJ	Telefonia VoIP	Participante	Vigência não informada Vigente	03 - Telefonia VoIP	Editar Excluir
PE-RP 016/2024 PRODERJ	Appliances para backup	Adesão	Vigência não informada Vigente	10 - Appliances para backup	Editar Excluir
PERP 12/25 PRODERJ	Licenciamento de softwares Microsoft ARP PRODERJ em fase de assinatura e publicação.	Participante	Vigência não informada Vigente	07 - Licenças Microsoft	Editar Excluir

Figura 26 — Catálogo de atas.

- 1

Cadastrar ata (perfis operacionais).
- 2

Busca por número, órgão gerenciador, objeto ou fornecedor.
- 3

Cada ata mostra o uso pela FAETEC (adesão ou participante), a vigência e as contratações vinculadas.

A cor da vigência indica: Vigente , Vence em até 60 dias , Vencida ou Vigência não informada .

Cadastrar ata de registro de preços

Número da ata *

Órgão gerenciador *

ARP 032/2026

SEAD/MA, PRODERJ...

Objeto

Fornecedor

Forma de uso pela FAETEC

Adesão (carona) Participante

Vigência início

Vigência fim

Situação

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Vigente

Link (PNCP, Diário Oficial, SEI)

https://

Observação

Cancelar

Salvar

Figura 27 — Cadastro de ata.

GATE DA ETAPA II

Sem ata válida com adesão possível, o fluxo de ARP é interrompido. Mantenha a vigência e a situação das atas atualizadas.

CAPÍTULO 12

Relatórios

Reports semanal, mensal e por período, carteira, prazos e pendências, com filtros e exportação.

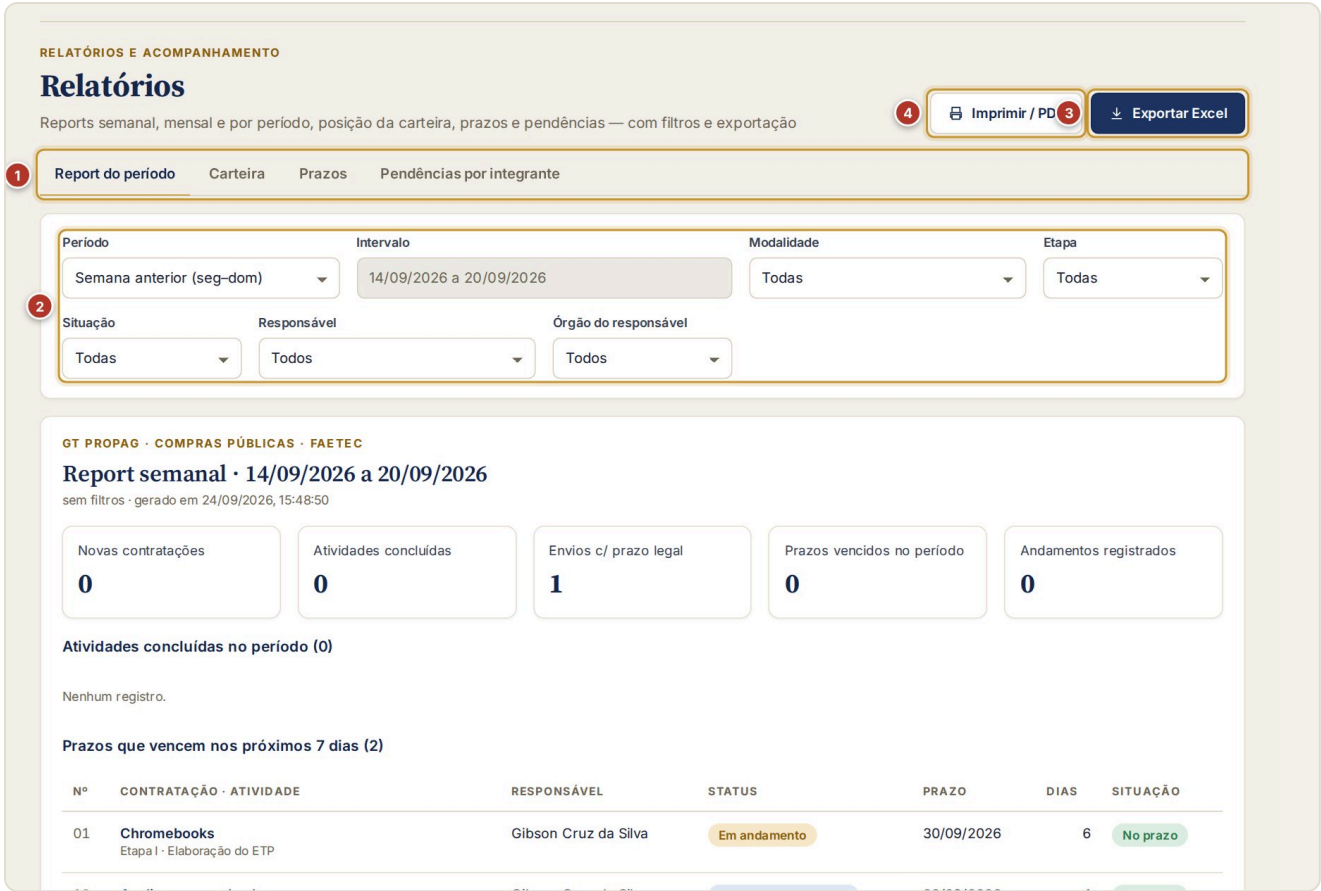


Figura 28 — Relatórios.

- 1 **Tipo de relatório:** Report do período, Carteira, Prazos e Pendências por integrante.
- 2 **Filtros:** período (semana anterior, mês corrente ou personalizado), modalidade, etapa, situação, responsável e órgão do responsável.
- 3 **Exportar Excel** — planilha com uma aba para cada seção do relatório.
- 4 **Imprimir / PDF** — versão para impressão, sem menus. Para gerar PDF, escolha “Salvar como PDF” na janela de impressão.

Relatório	Conteúdo
Report do período	Novas contratações, atividades concluídas, envios com prazo legal, prazos vencidos no período, andamentos registrados, prazos dos próximos 7 dias e posição da carteira. <i>Semanal</i> = semana anterior (segunda a domingo); <i>mensal</i> = mês corrente.

Relatório	Conteúdo
Carteira	Posição de todas as demandas, com totais por situação e por etapa e o valor estimado.
Prazos	Todas as atividades com prazo legal ou interno, filtráveis pela situação do prazo (vencido, vence em breve, no prazo, contagem não iniciada, cumprido).
Pendências por integrante	Atividades abertas, vencidas e a vencer de cada integrante, com o detalhamento individual.

CAPÍTULO 13

Equipe do GT

Quem faz o quê no fluxo, formato de trabalho e carga atual.

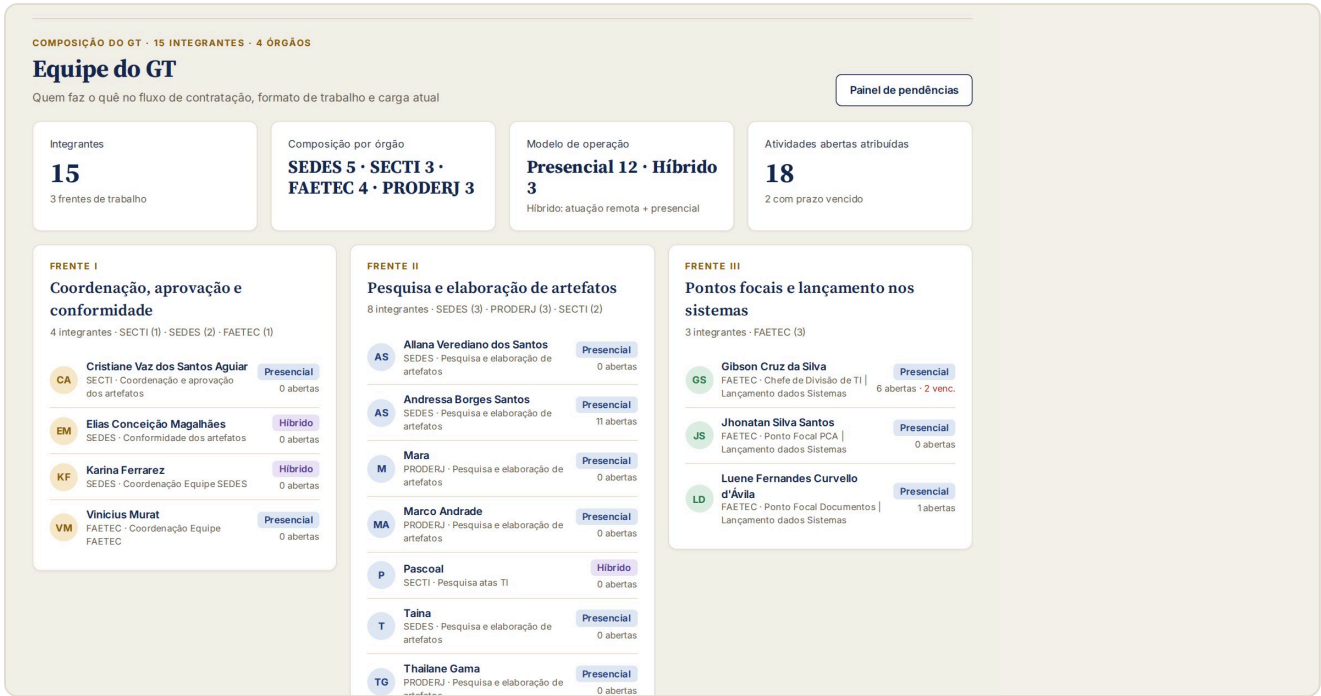


Figura 29 — Composição do GT por frente.

A tela mostra os integrantes por frente, com órgão, função, modelo de trabalho (presencial ou híbrido) e atividades abertas. Clique em um integrante para ver as pendências dele.

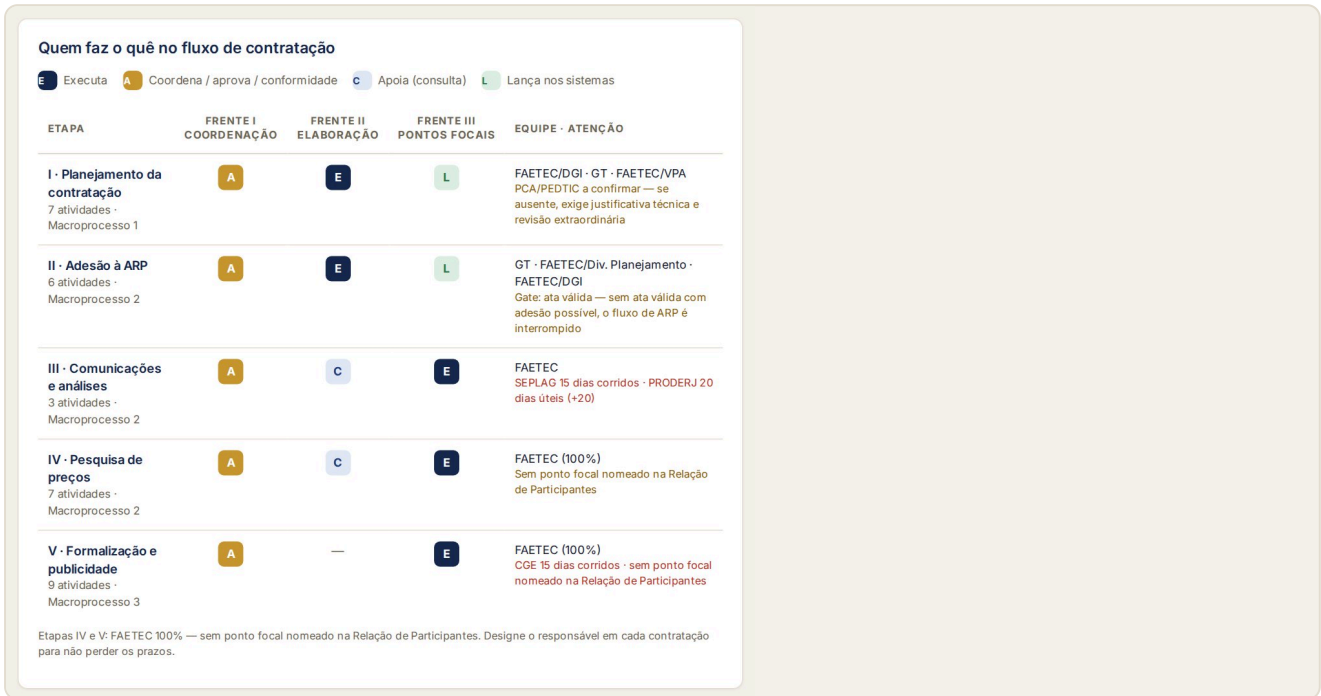


Figura 30 — Matriz “Quem faz o quê no fluxo de contratação”.

Legenda da matriz: **E** executa · **A** coordena, aprova e verifica a conformidade · **C** apoia (consulta) · **L** lança nos sistemas. Ao lado ficam a **carga atual** por integrante (em vermelho, os vencidos) e o resumo dos **perfis de acesso**.

CAPÍTULO 14

Auditoria

Quem alterou, quando e o quê. Disponível para Administrador, Coordenação e Conformidade.

ADMINISTRAÇÃO · TRILHA IMUTÁVEL

Auditoria

Quem alterou, quando e o quê — antes e depois de cada campo. Registros gravados pelo banco, sem possibilidade de edição.

2

Exportar Excel

1

De25/08/2026Até24/09/2026UsuárioTodosRegistroTodosOperaçãoTodas

QUANDO	QUEM	OPERAÇÃO	REGISTRO	CONTRATAÇÃO	CAMPOS ALTERADOS
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Andamento Comunicação à SEPLAG: envio em 11/09/2026 · prazo legal até	10 - Appliances para backup	— Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Inclusão	Andamento Comunicação à SEPLAG: Pendente → Aguardando terceiros	10 - Appliances para backup	— Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Alteração	Contratação Appliances para backup	10 - Appliances para backup	Último andamento, Data do último andamento Detalhes
24/09/2026, 15:45	Gibson Cruz da Silva	Alteração	Atividade Comunicação à SEPLAG	10 - Appliances para backup	Data de envio, Início, Prazo legal, Responsável, Status Ocultar

3

CAMPO	ANTES	DEPOIS
Data de envio	—	11/09/2026
Início	—	24/09/2026
Prazo legal	—	28/09/2026
Responsável	—	Gibson Cruz da Silva
Status	Pendente	Aguardando terceiros

24/09/2026, 15:45Lueene FernandesInclusãoDocumento01 - Chromebooks—[Detalhes](#)

Figura 31 — Trilha de auditoria com o detalhe de uma alteração.

- 1 Filtros — período (padrão: últimos 30 dias), usuário, tipo de registro e operação (inclusão, alteração ou exclusão).
- 2 Exportar Excel — até 10.000 registros, com os valores anteriores e novos.
- 3 Detalhe — clique em uma linha para ver campo a campo o valor *antes* (vermelho) e *depois* (verde).

REGISTRO IMUTÁVEL

Os registros são gravados pelo próprio banco de dados a cada alteração, e nenhum usuário, nem mesmo o administrador, consegue editá-los ou apagá-los pelo sistema. A auditoria cobre contratações, atividades, responsáveis, andamentos, documentos, atas, integrantes e todas as configurações.

CAPÍTULO 15

Manutenção (administrador)

Integrantes e perfis, listas suspensas, áreas, feriados, atividades, prazos e modalidades.

ADMINISTRAÇÃO · CONTROLE TOTAL

Manutenção

Integrantes e perfis de acesso, listas suspensas, catálogos e regras do fluxo. Tudo registrado na auditoria.

1
Integrantes e perfis
Listas suspensas
Áreas demandantes
Feriados
Atividades e prazos
Modalidades

Integrantes (16)

Cadastre o e-mail institucional: a pessoa entra por "Primeiro acesso" e a conta é vinculada automaticamente ao perfil. E-mails não cadastrados não conseguem criar conta.

☐ Mostrar inat
2
+ Novo integrante

NOME	ÓRGÃO · FRENTE	FUNÇÃO	PERFIL DE ACESSO	E-MAIL · ACESSO	3	TRABALHO	4
Administrador do sistema Conta técnica (fora do GT)	FAETEC	Administração do sistema	Administrador	rodrigo.maul@desenvolvimento.rj.gov.br ● conta ativa		Presencial	Editar
Allana Verediano dos Santos	SEDES · Frente II	Pesquisa e elaboração de artefatos	Elaboração de artefatos	sem e-mail não pode acessar		Presencial	Editar
Andressa Borges Santos	SEDES · Frente II	Pesquisa e elaboração de artefatos	Elaboração de artefatos	sem e-mail não pode acessar		Presencial	Editar
Cristiane Vaz dos Santos Aguiar	SECTI · Frente I	Coordenação e aprovação dos artefatos	Coordenação	sem e-mail não pode acessar		Presencial	Editar
Elias Conceição Magalhães	SEDES · Frente I	Conformidade dos artefatos	Conformidade	sem e-mail não pode acessar		Híbrido	Editar
Gibson Cruz da Silva	FAETEC · Frente III	Chefe de Divisão de TI Lançamento dados Sistemas	Ponto focal FAETEC	gibson.silva@faetec.rj.gov.br ● conta ativa		Presencial	Editar
Jhonatan Silva Santos	FAETEC · Frente III	Ponto Focal PCA Lançamento dados Sistemas	Ponto focal FAETEC	sem e-mail não pode acessar		Presencial	Editar
Karina Ferrarez	SEDES · Frente I	Coordenação Equipe SEDES	Coordenação	karina.ferrarez@desenvolvimento.rj.gov.br aguardando primeiro acesso		Híbrido	Editar

Figura 32 — Manutenção — integrantes e perfis.

- 1 **Abas** da manutenção.
- 2 **Novo integrante**.
- 3 **E-mail e situação do acesso**: "conta ativa", "aguardando primeiro acesso" ou "sem e-mail" (não pode acessar).
- 4 **Editar** o cadastro e o perfil.

15.1 Cadastrar integrante e liberar o acesso

Figura 33 — Cadastro do integrante e perfil de acesso.

- 1 **E-mail institucional** — é o que libera o acesso e vincula a conta ao integrante.
- 2 **Perfil de acesso** — Administrador, Coordenação, Conformidade, Elaboração de artefatos, Ponto focal FAETEC ou Consulta (Capítulo 3).
- 3 **Ativo** — desmarque para cortar o acesso imediatamente, sem apagar o histórico.

- 1 Clique em **Novo integrante** (ou **Editar**, para os integrantes já cadastrados).
- 2 Preencha nome, e-mail institucional, órgão, frente, modelo de trabalho e função, e escolha o perfil de acesso.
- 3 Clique em **Salvar**. O integrante aparece como “aguardando primeiro acesso”.
- 4 Oriente o integrante a entrar em **Primeiro acesso** com esse e-mail (Capítulo 4.1).

ENQUANTO O ENVIO DE E-MAILS NÃO ESTIVER CONFIGURADO

O primeiro acesso depende do e-mail de confirmação. Se ele não chegar, o administrador cria a conta diretamente no painel do Supabase:

1. No projeto **gt-propag-contratacoes**, vá em **Authentication > Users > Add user > Create new user**.
2. Informe o mesmo e-mail cadastrado no sistema e uma senha provisória, e deixe **Auto Confirm User** marcado.
3. Envie o endereço do sistema e a senha provisória ao integrante por canal seguro, orientando-o a trocá-la em **Alterar senha** no primeiro acesso.

PROTEÇÕES

O sistema não permite ficar sem administrador ativo nem que o administrador desative a própria conta. E-mails não cadastrados não conseguem criar conta.

15.2 Listas suspensas

Situação da contratação

Situação da contratação

ORDEM	VALOR	COR DO SELO	ATIVO
1	Em instrução	azul	☒
2	Em andamento	ouro	☒
3	Aguardando	cinza	☒
4	Devolvida	vermelho	☒
5	Divergência	vermelho	☒
6	Sem justificativa	vermelho	☒
7	Suspensa	cinza	☒
8	Concluída	verde	☒
9	Cancelada	cinza	☒

Nova opção

Valor

Incluir

Para retirar uma opção sem perder o histórico, desmarque "Ativo". Registros antigos mantêm o valor.

Figura 34 — Listas suspensas do painel.

Escolha a lista (situação da contratação, status do DOD, da ata, da manifestação do TI, da fase preparatória, origem da estimativa ou tipo de documento). Para cada opção é possível alterar a ordem e a cor do selo e ativar ou desativar a opção. Para incluir, use **Nova opção**. Para retirar uma opção sem perder o histórico, desmarque **Ativo**.

15.3 Atividades e prazos

Editar Comunicação à SEPLAG

Etapa

III · Comunicações e a

Ordem

1

Nome

Comunicação à SEPLAG

Prazo legal

Dias corridos

Dias

15

Prorrogação (dias)

Ponto de atenção

Prazo: 15 dias corridos

Base legal

Decreto 48.821/2023 (art. 2º)

☐ Gate (bloqueia o fluxo se não atendido)

☒ Ativa

Cancelar

Salvar

Figura 35 — Edição de uma atividade do modelo (prazo legal).

Define o modelo das 32 atividades: etapa, ordem, nome, prazo legal (dias corridos ou úteis, quantidade e prorrogação), ponto de atenção, base legal, gate e se a atividade está ativa. **As alterações valem para novas contratações e trocas de modalidade.** Checklists já gerados não mudam.

15.4 Modalidades

Modalidades e etapas do checklist							
Define quais etapas são geradas para cada enquadramento. Trocar a modalidade de uma contratação ajusta o checklist.							
MODALIDADE	I	II	III	IV	V	ATIVIDADES	ATIVA
Adesão à ARP Carona em ata de outro órgão · fluxo completo	☒	☒	☒	☒	☒	32	☒
Participante de RP FAETEC participa da ata (ex.: PRODERJ) e usa o ETP do gerenciador	☒	☐	☒	☒	☒	26	☒
Dispensa Art. 75 da Lei 14.133/2021 · sem Etapa II	☒	☐	☒	☒	☒	26	☒
Inexigibilidade Art. 74 da Lei 14.133/2021 · sem Etapa II	☒	☐	☒	☒	☒	26	☒
Licitação própria Fase externa ainda não mapeada no fluxo do GT	☒	☐	☒	☒	☒	26	☒
A definir Gera só a Etapa I até o enquadramento	☒	☐	☐	☐	☐	7	☒

Figura 36 — Etapas geradas por modalidade.

Marque quais etapas cada modalidade gera. A Etapa I é obrigatória em todas. A coluna “Atividades” mostra o total resultante.

15.5 Feriados e áreas demandantes

Feriados e pontos facultativos

Usados na contagem de dias úteis (PRODERJ) e na prorrogação de vencimentos que caem em dia não útil.

DATA	DESCRIÇÃO	
01/01/2026 · qui.	Confraternização Universal	Remover
20/01/2026 · ter.	São Sebastião (Município do Rio)	Remover
16/02/2026 · seg.	Carnaval (ponto facultativo)	Remover
17/02/2026 · ter.	Carnaval	Remover
03/04/2026 · sex.	Paixão de Cristo	Remover
21/04/2026 · ter.	Tiradentes	Remover
23/04/2026 · qui.	São Jorge (RJ)	Remover
01/05/2026 · sex.	Dia do Trabalho	Remover

Incluir feriado

dd/mm/yyyy

Descrição

Incluir

Figura 37 — Feriados e pontos facultativos.

Os feriados são usados na contagem de dias úteis e na prorrogação de vencimentos. A carga inicial traz os feriados nacionais, estaduais (RJ) e municipais (Rio de Janeiro) de 2026 e 2027, além de pontos facultativos (Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor). **Mantenha a lista atualizada a cada ano** e remova os pontos facultativos que não se aplicarem. Na aba **Áreas demandantes**, cadastre e ajuste as diretorias e setores que originam as demandas.

CAPÍTULO 16

Rotina recomendada por perfil

Boas práticas para manter o controle dos prazos e a qualidade do registro.

Perfil	Diariamente	Semanalmente
Todos	Abrir Minhas pendências e tratar primeiro os vencidos e os que vencem em até 5 dias. Ler as notificações.	Conferir se todas as atividades em andamento têm observação atualizada.
Coordenação	Verificar no Painel as contratações que pedem ação e os prazos legais . Designar responsáveis para as demandas "sem responsável".	Gerar o Report semanal e revisar a Visão da equipe (carga e vencidos). Validar divergências.
Conformidade	Validar artefatos concluídos e registrar divergências na contratação.	Revisar a auditoria das alterações relevantes.
Elaboração (Frente II)	Atualizar o status das atividades das Etapas I e II e anexar os artefatos (DOD, ETP, TR, Mapa de Riscos).	Atualizar o catálogo de atas (vigência e situação).
Ponto focal (Frente III)	Registrar no mesmo dia as datas de envio à SEPLAG, ao PRODERJ e à CGE. Lançar processo SEI, ID SIGA e valores.	Conferir o relatório de Prazos e cobrar os órgãos antes do vencimento.
Administrador	Liberar o acesso de novos integrantes.	Revisar a Qualidade do registro no painel e as listas suspensas. Atualizar os feriados anualmente.

CAPÍTULO 17

Dúvidas frequentes

Situações comuns e como resolvê-las.

Situação	O que fazer
"E-mail não cadastrado como integrante ativo do GT"	O administrador precisa cadastrar o seu e-mail em Manutenção > Integrantes (ou reativar o cadastro).
O e-mail de confirmação ou de redefinição de senha não chegou	Verifique a caixa de spam. Se não houver, peça ao administrador para criar ou redefinir o acesso (Capítulo 15.1).
"Acesso não liberado" depois do login	A conta existe, mas o integrante está inativo ou com outro e-mail cadastrado. Procure o administrador.
"Seu perfil de acesso não permite esta operação"	A ação não faz parte do seu perfil (Capítulo 3). Peça a quem tem a permissão ou ao administrador.
O prazo legal não aparece	Falta registrar a data de envio na atividade (Capítulo 9.3).
O vencimento caiu em data diferente da esperada	O sistema prorroga vencimentos em fim de semana ou feriado e desconta feriados nos dias úteis. Confira a lista de feriados em Manutenção.
A Etapa II não aparece no checklist	A modalidade não prevê a Etapa II (Dispensa, Inexigibilidade, Participante de RP, Licitação própria ou A definir).
Troquei a modalidade e sumiram atividades	Atividades de etapas que deixaram de se aplicar e nunca foram tocadas são removidas. As que tinham registro ficam como "Não se aplica". Voltar à modalidade anterior as recria ou reativa.
Não consigo anexar um arquivo	Formatos aceitos: PDF, DOC, DOCX, XLS e XLSX, com até 50 MB cada.
Quero desfazer uma alteração	Consulte o valor anterior no Histórico (auditoria) e altere o campo novamente. A correção também fica registrada.

ANEXO A

As 32 atividades do fluxo

Modelo do caminho crítico aplicado a cada contratação.

Etapa	Nº	Atividade	Prazo / atenção
I Planejamento	1	Identificação da demanda	
	2	Inclusão no PCA / PEDTIC	Se ausente do PEDTIC: justificativa técnica e revisão extraordinária
	3	Elaboração do DOD	
	4	Elaboração do ETP	Reaproveitado do gerenciador em Participante de RP
	5	Elaboração do TR	
	6	Mapa de Riscos	
	7	Aprovação e autorização (VPA)	
II Adesão à ARP	1	Anuência do órgão gerenciador	
	2	Anuência do fornecedor	
	3	Verificação de ata válida	Gate sem ata válida, o fluxo de ARP é interrompido
	4	Inserção dos documentos da ARP	
	5	Compatibilidade do objeto	
	6	Justificativa de vantajosidade	Enunciado 27 PGE-RJ
III Comunicações e análises	1	Comunicação à SEPLAG	15 dias corridos
	2	Análise técnica do PRODERJ (TIC)	20 dias úteis (+20)
	3	Registro no Contratos.gov.br	

Etapa	Nº	Atividade	Prazo / atenção
IV Pesquisa de preços	1	Pesquisa de preços no SIGA	Sem ponto focal nomeado
	2	Relatório Analítico (RAPP)	
	3	Ateste do setor técnico	
	4	Checklist PGE	Enunciado 27 PGE-RJ
	5	Aprovação da pesquisa (SIGA)	
	6	Disponibilidade orçamentária	
	7	Declaração do ordenador de despesas	
V Formalização e publicidade	1	Documentos de habilitação	Sem ponto focal nomeado
	2	Minuta do contrato	
	3	Análise jurídica	
	4	Nota de auditoria (UCI)	
	5	Análise da CGE	15 dias corridos
	6	Empenho	
	7	Assinatura do contrato	
	8	Publicação (D.O. / PNCP)	Lei 14.133/2021
	9	Cadastro e-TCE (SIGFIS)	

Exposição legal mínima: 15 + 20 (+20) + 15 dias em 3 gates que não podem atrasar.

ANEXO B

Glossário

Siglas e termos usados no sistema.

ARP

Ata de Registro de Preços.

Adesão (carona)

Uso, pela FAETEC, de ata gerenciada por outro órgão.

CGE

Controladoria Geral do Estado.

Checklist

Conjunto das atividades geradas para a contratação conforme a modalidade.

DGI

Unidade da FAETEC que abriga a Divisão de TI e participa da Etapa I.

DOD

Documento de Oficialização da Demanda.

e-TCE / SIGFIS

Sistema de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

ETP

Estudo Técnico Preliminar.

Gate

Ponto de controle que interrompe o fluxo se não for atendido.

GT PROPAG

Grupo de Trabalho de Compras Públicas.

PCA / PEDTIC

Plano de Contratações Anual / Plano Estratégico de TIC.

Participante de RP

FAETEC participa do registro de preços desde a origem.

PNCP

Portal Nacional de Contratações Públicas.

PRODERJ

Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do RJ.

RAPP

Relatório Analítico de Pesquisa de Preços.

Responsável geral

Integrante da coordenação que responde pela contratação.

SEI

Sistema Eletrônico de Informações (processos).

SEPLAG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

SIGA

Sistema Integrado de Gestão de Aquisições.

TR

Termo de Referência.

UCI

Unidade de Controle Interno.

VPA

Instância da FAETEC que aprova e autoriza a contratação ao fim da Etapa I.
