

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA • ATUALIZAÇÃO

Status das contratações da FAETEC

A carteira passou de 17 para 20 demandas na planilha do GT. O que mudou, o que diverge e o que precisa de decisão.

ETAPA I
Planejamento

ETAPA II
Adesão à ARP

ETAPA III
Comunicações

ETAPA IV
Pesquisa de preços

ETAPA V
Formalização

A carteira cresceu, mas continua no planejamento

1

17 → 20 demandas

Saldo de +3 na planilha: 5 objetos novos e 2 que saíram (Tela interativa e Firewall). Com a Tela mantida ativa, a carteira consolidada tem 21.

2

O planejamento andou

DOD elaborado 5 → 7, manifestação favorável do TI 1 → 5, processo SEI novo 3 → 17. Nenhuma demanda passou da Etapa I.

3

99% sem responsável

No sistema, 256 de 259 atividades abertas não têm integrante designado. Nenhuma demanda tem responsável geral.

4

9 divergências na planilha

Firewall × Firewall Fortinet, possível dupla contagem de computadores, 4 processos SEI com ano incoerente, entre outras.

Painel de contratações

Imagem 3840 × 2160 (4K) · dados idênticos à produção em 25/09 · 1ª carga, 17 demandas

GT PROPAG · COMPRAS

FAETEC

Controle de contratações

Painel

Contratações

Minhas pendências

Atas de registro

Relatórios

Equipe do GT

ADMINISTRAÇÃO

Auditoria

Manutenção

ADMIN

FLUXO DE CONTRATAÇÃO · 5 ETAPAS · 32 ATIVIDADES

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Painel de contratações

Posição em 25/09/2026 · 17 demandas em carteira · última atualização 24/09/2026, 14:33

Relatórios

Report semanal

Report mensal

Report por período

Modalidade: todas

Etapas: todas

Responsável: todos

Demandas em carteira

17

todas na Etapa I · Planejamento da contratação

Valor estimado informado

R\$ 69,68 mi

apenas 3 de 17 demandas com valor

Sem justificativa da área

7

ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 · bloqueiam o DOD

Prazos legais em contagem

0

nenhuma demanda com envio registrado na Etapa III/V

Caminho crítico · demandas por etapa

ETAPA I

Planejamento da contratação

17

7 atividades · FAETEC/DGI · GT · FAETEC/VPA

PCA/PEDTIC a confirmar

ETAPA II

Adesão à ARP

0

6 atividades · GT · FAETEC/Div. Planejamento · FAETEC/DGI

Gate: ata válida

ETAPA III

Comunicações e análises

0

3 atividades · FAETEC

SEPLAG 15 dias corridos · PRODERJ 20 dias úteis (+20)

ETAPA IV

Pesquisa de preços

0

7 atividades · FAETEC (100%)

Sem ponto focal nomeado na Relação de Participantes

ETAPA V

Formalização e publicidade

0

9 atividades · FAETEC (100%)

CGE 15 dias corridos

Etapa I · andamento das atividades

Concluída

Em andamento

Pendente

Justificativa da área

10 de 17

DOD

5 de 17

Definição da via (ata)

7 de 17

Manifestação do TI

1 de 17

ETP

2 de 17

TR · Mapa de riscos

0 de 17

ETP concluído incluiu o reaproveitamento do ETP do órgão gerenciador quando a FAETEC é participante da ata.

Prazos legais e prazos vencidos

Relatório de prazos

Nenhum prazo em contagem. O prazo legal começa quando a data de envio é registrada na atividade (Comunicação à SEPLAG, Análise técnica do PRODERJ, Análise da CGE).

Prazos legais monitorados

Comunicação à SEPLAG

15 dias corridos

A carteira em quatro números

Demandas na planilha

20

+3 sobre a 1ª carga • 21 com a Tela

Valor informado (R\$ mi)

69,7

inalterado • só 3 de 20 com valor

Sem justificativa

6


eram 7 na 1ª carga

Atividades previstas

354

eram 276 • projeção, fora do sistema

Marcos do planejamento • 1ª carga (17) × 2ª carga (20)

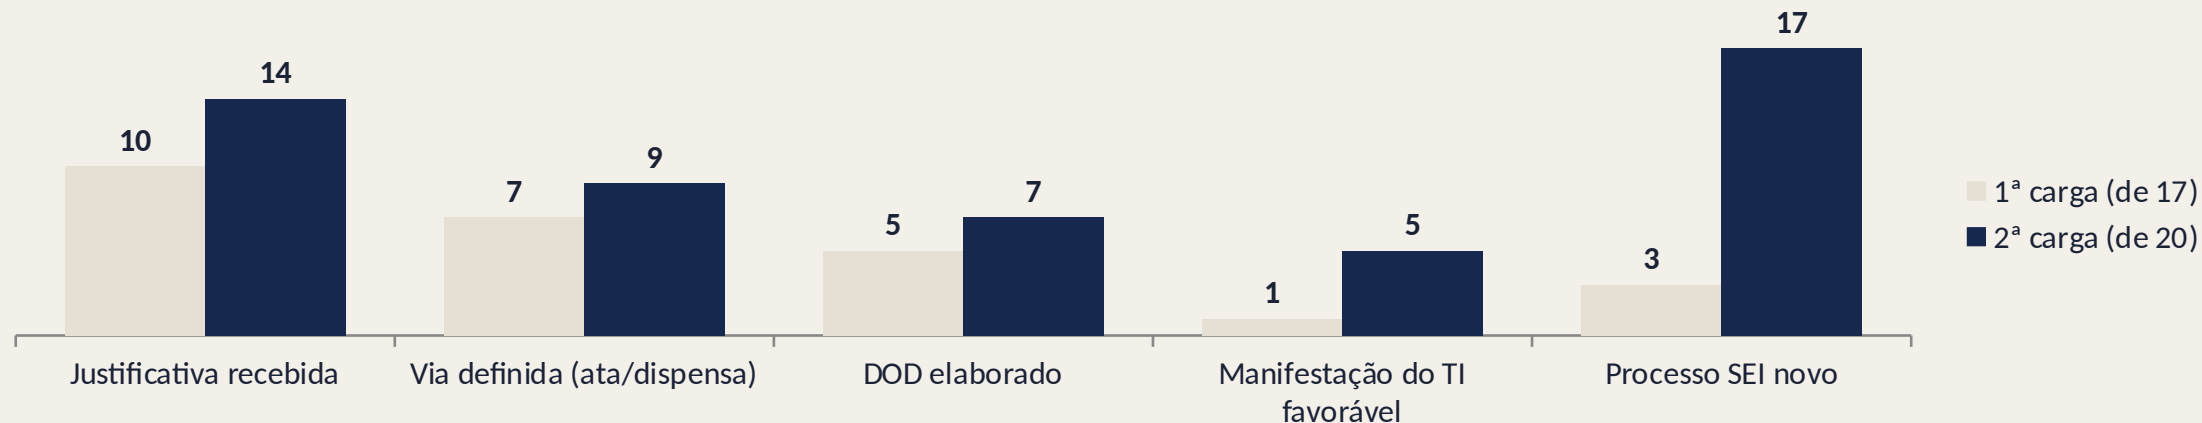

“Mais 3 linhas” são 5 entradas e 2 saídas

15

Continuam

mesmo objeto; 8 renumeradas

- Chromebooks • Softwares • VoIP • Câmeras
- Link (06→05) • Microsoft (07→06)
- Antivírus (08→07) • Computadores (09→08)
- Appliances • Switch ToR
- Servidor (13→12) • Rack (14→13)
- Pontos lógicos • Telefonia móvel • Switch core

5

Entraram

sem correspondente no sistema

- 09 • Computadores avançados (desmembrado)
- 14 • Access Point
- 18 • Switch de acesso
- 19 • Firewall Fortinet
- 20 • Computador quântico

2

Saíram da planilha

seguem ativas no sistema

- 05 • Tela interativa — mantida ativa por decisão do GT
- 12 • Firewall — ponto de atenção: pode ter sido substituído pelo Firewall Fortinet

Conta: $17 - 2 + 5 = 20$ linhas na planilha. Carteira consolidada: **20 + Tela interativa = 21** (22 se o Firewall do sistema for uma demanda distinta do Firewall Fortinet).

Número na planilha × número no sistema

Plan.	Objeto	Sist.	Mudança
01	Chromebooks	01	TI de acordo; ETP elaborado
02	Softwares edição/arquitetura/eng.	02	Retornou ao GT com observações
03	Telefonia VoIP	03	SEI novo informado
04	Câmeras de segurança	04	Aguarda revisão da justificativa
05	Link de internet (SD-WAN)	06	Renumerada • DOD elaborado
06	Licenças Microsoft	07	Renumerada • TI SIM
07	Antivírus com EDR	08	Renumerada • DOD elaborado
08	Computadores básicos, notebooks, monitores	09	Renumerada • desmembrada
09	Computadores avançados	—	Nova (saiu do item 09 do sistema)
10	Appliances para backup	10	TI de acordo; ETP elaborado
11	Switch top of rack	11	SEI novo; sem justificativa

Plan.	Objeto	Sist.	Mudança
12	Servidor hiperconvergente	13	Renumerada
13	Rack 19U	14	Renumerada • ata ARP 167/2025
14	Access Point	—	Nova
15	Pontos lógicos	15	SEI com ano 2028
16	Telefonia móvel	16	SEI com ano 2029
17	Switch core	17	SEI com ano 2025; sem quantitativo
18	Switch de acesso	—	Nova
19	Firewall Fortinet	12?	Nova ou substitui o Firewall
20	Computador quântico	—	Nova
—	Tela interativa	05	Fora da planilha • mantida ativa
—	Firewall	12	Fora da planilha • ponto de atenção

Firewall (sistema) × Firewall Fortinet (planilha)

Campo	1ª carga · Firewall	2ª carga · Firewall Fortinet
Número	12 no sistema e na 1ª carga	19 na planilha de 24/09 (o 12 agora é o Servidor)
Objeto	Firewall — genérico	Firewall Fortinet — indica marca
Processo SEI	não informado	SEI-260005/008714/2026
Justificativa / DOD	sem justificativa no drive	recebida em 24/09 · DOD em análise
Quantitativo	não informado	2 NGFW, 2 conjuntos de licenças, 3 tipos de console (2 de cada), treinamento (3)
Ata · TI	sem ata · sem manifestação	sem ata · TI: NÃO
No sistema	ativo · a definir · 7 atividades	não existe

Decisão do GT

É a mesma demanda, agora detalhada? Então o 12 do sistema é atualizado e a carteira fica com 21. Se for outra, o Firewall genérico continua e a carteira vai a 22.

Indicação de marca

Citar “Fortinet” no objeto exige justificativa formal (padronização ou compatibilidade), conforme o art. 41, I, da Lei 14.133/2021. Sem ela, o DOD e o TR ficam expostos a questionamento.

Nove divergências a resolver antes da carga

#	Divergência	Onde (nº planilha)	O que fazer
1	Firewall × Firewall Fortinet	19 • sistema 12	Confirmar se é a mesma demanda
2	Possível dupla contagem de computadores	08 × 09	Quantitativo do 08 inclui 2.140 de alto desempenho; o 09 é “avançados”
3	Objeto × quantitativo não batem	08	Objeto: 2.260 notebooks e 7.640 + 600 monitores; quantitativo: 600 monitores
4	Processo SEI com ano ≠ 2026	13 • 15 • 16 • 17	Anos 2027, 2028, 2029 e 2025 — conferir no SEI
5	Nº da ARP diverge	02	DOD cita ARP 147/2024; ata cita 1477/2024 (CELIC/RS)
6	Tela interativa fora da planilha	sistema 05	Mantida ativa; confirmar com a área demandante
7	Sem processo SEI	14 • 18 • 20	Abrir ou informar o processo
8	Informação regrediu	12 • Servidor	1ª carga: “já tem ata e aceite”; 2ª: “sem justificativa”
9	Objeto atípico, sem quantitativo	20 • Comp. quântico	Validar a necessidade e a aderência ao PEDTIC


32 atividades por fluxo: confirmado

Número	Valor	Conferência	Status
Atividades do fluxo	32	$7 + 6 + 3 + 7 + 9$ (Etapas I a V) · documento = sistema	Confirmado
Por macroprocesso	$7 \cdot 16 \cdot 9$	Etapa I · Etapas II a IV ($6 + 3 + 7$) · Etapa V	Confirmado
Checklist no sistema (1ª carga)	276	$4 \text{ adesões} \times 32 + 3 \times 26 + 10 \text{ a definir} \times 7 \cdot \text{consulta à produção}$	Confirmado
Situação das 276	$17 \cdot 9 \cdot 250$	concluídas · em curso ($5 + 2 + 2$) · pendentes	Confirmado
Checklist da 2ª carga (20)	347	$6 \times 32 + 3 \times 26 + 11 \times 7$, pela mesma regra da 1ª carga	Projeção
Consolidado com a Tela (21)	354	$347 + 7$ (Tela interativa, a definir)	Projeção
Prazos legais previstos	$21 \rightarrow 27$	$7 \rightarrow 9$ demandas com via definida $\times 3$ prazos	Projeção

Ponte 276 → 354: +60 das 5 novas (Access Point $32 + 4 \times 7$) · +25 Rack 19U (a definir → adesão) · -7 Firewall do sistema fora da planilha

A regra que enquadra a modalidade pela coluna “Ata” da planilha, aplicada à 1ª carga, reproduz exatamente as 276 atividades da produção — por isso a projeção é confiável. Detalhe completo no relatório de verificação.

Nenhuma demanda passou da Etapa I

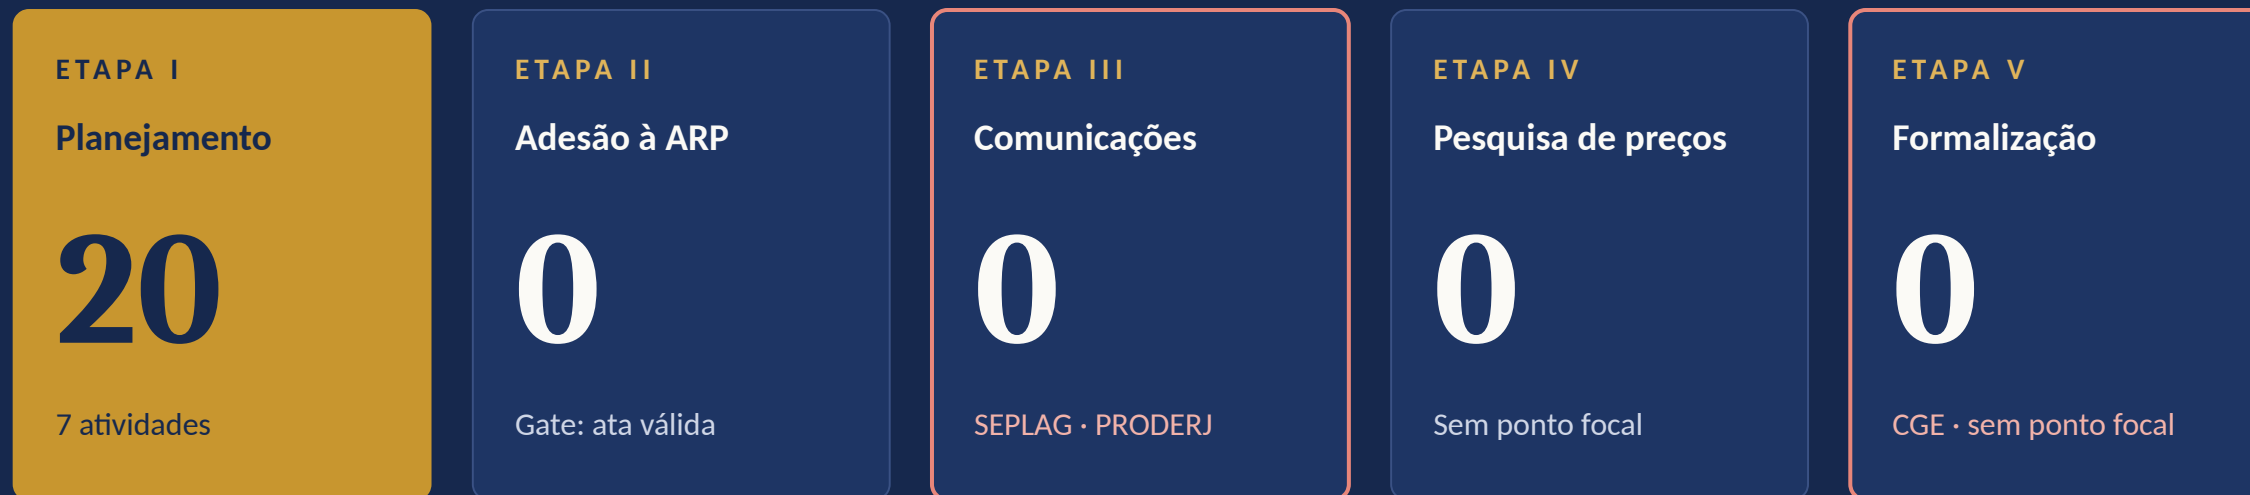

As 20 demandas da planilha (17 no sistema) estão no planejamento. Cada uma ainda tem pela frente **58 a 86 dias corridos** só de análises externas — SEPLAG 15 corridos, PRODERJ 20 úteis (+20) e CGE 15 corridos.

CONCENTRAÇÃO DE VALOR

93% do valor em uma única demanda



17

de 20 demandas sem valor estimado

Eram 14 de 17. O tamanho real da carteira segue desconhecido.

A 2ª carga não trouxe nenhum valor novo: são os mesmos R\$ 69,68 mi da 1ª carga. Agora, porém, 10 demandas têm quantitativo informado — base para a estimativa.

5 podem avançar; 8 esperam justificativa ou revisão

5

Podem avançar

DOD elaborado e via definida

01 • Chromebooks
03 • Telefonia VoIP
06 • Licenças Microsoft
07 • Antivírus com EDR
10 • Appliances para backup

8

Em análise ou ajuste

Justificativa recebida, DOD em análise

02 • Softwares (retornou com obs.)
08 • Computadores
13 • Rack 19U
16 • Telefonia móvel
17 • Switch core
19 • Firewall Fortinet
20 • Computador quântico
Tela interativa (sist. 05)

8

Travadas

Sem justificativa (6)

09 Computadores avançados • 11 Switch ToR • 12 Servidor hiperconvergente • 14 Access Point • 15 Pontos lógicos • 18 Switch de acesso

Devolvidas à área técnica (2)

04 Câmeras (desde 24/09) • 05 Link de internet (desde 23/09)

Na 1ª carga eram 10 travadas de 17.

Quase nenhuma atividade tem dono

99%

das atividades abertas **sem responsável** no sistema — 256 de 259

0/17 demandas com responsável geral

0 responsáveis por etapa designados

2 integrantes com atividade: Gibson (2) e Luene (1)

GT PROPAG - COMPRAS

FAETEC

Controle de contratações

Painel

Contratações

Minhas pendências

Atas de registro

Relatórios

Equipe do GT

ADMINISTRAÇÃO

Auditoria

Manutenção

ADMIN

Rodrigo Maul

Perfil: Administrador

Toda ação é registrada na auditoria

Alterar senha

Sair

FLUXO DE CONTRATAÇÃO · 5 ETAPAS · 32 ATIVIDADES

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Contratações / 01

Nº 01 Adesão ARP Em andamento Prioridade alta

Chromebooks

Contratação para aquisição de equipamentos de informática – Chromebooks, visando atender às necessidades da FAETEC

Exportar ficha

Excluir

Etapa atual

I Planejamento da contratação

2 de 7 na etapa · 2 de 32 no fluxo

Atividade atual

Elaboração do ETP

Gibson Cruz da Silva

Próximo prazo

—

0 prazo(s) legal(is) em contagem

Valor estimado

R\$ 64,82 mi

Responsável geral: não definido

Checklist do fluxo

Dados e painel

Andamentos · 0

Documentos · 0

Histórico (auditoria)

Prazo legal crítico (contagem a partir da data de envio)

Ponto de atenção / gate

I Planejamento da contratação

Elaboração de artefatos · Frente II - FAETEC/DGI · GT - FAETEC/VPA · Decreto 48.816/2023 · IN PRODERJ/PRE 05/2024

Responsável da etapa...


2 de 7 concluídas

ATIVIDADE	STATUS	RESPONSÁVEL	PRAZO
Identificação da demanda	Concluída	Sem responsável	dd/mm/yyyy em 24/09/2026
Inclusão no PCA / PEDTIC Se ausente do PEDTIC: exige justificativa técnica e revisão extraordinária Decreto 48.816/2023	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy
Elaboração do DOD	Concluída	Sem responsável	dd/mm/yyyy em 24/09/2026
Elaboração do ETP IN PRODERJ/PRE 05/2024	Em andamento	Gibson Cruz da Silva · FA	dd/mm/yyyy
Elaboração do TR	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy
Mapa de Riscos	Pendente	Sem responsável	dd/mm/yyyy


Checklist da demanda 01 no sistema: atividades “Sem responsável” e responsável geral “não definido”.

O SISTEMA POR DENTRO

Tudo o que está nesta apresentação sai do sistema

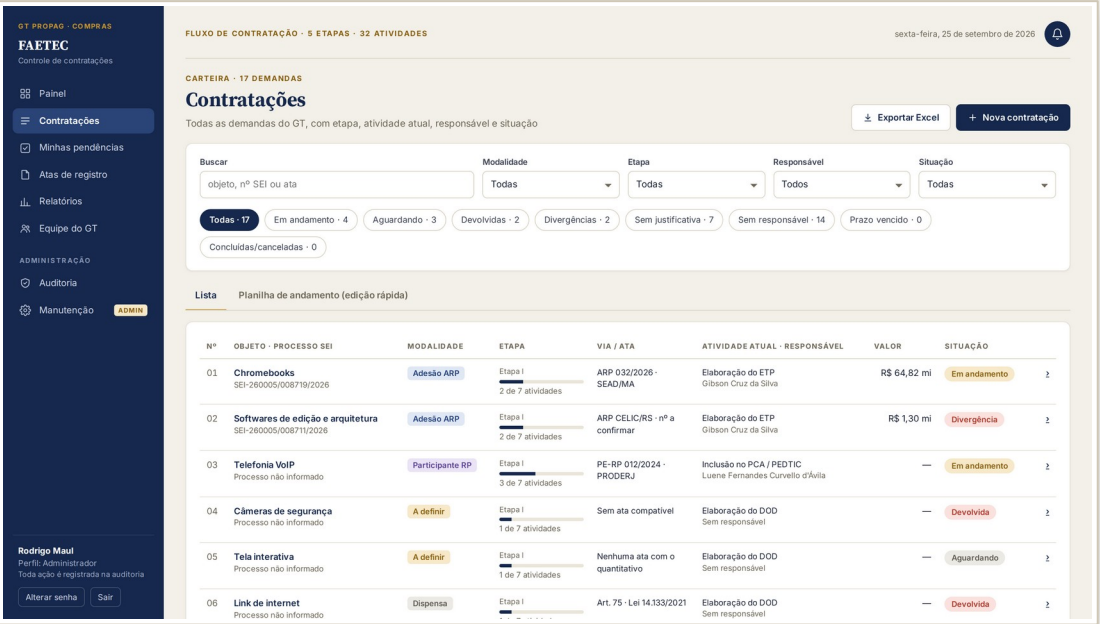

Contratações · lista com filtros rápidos, etapa, responsável e situação

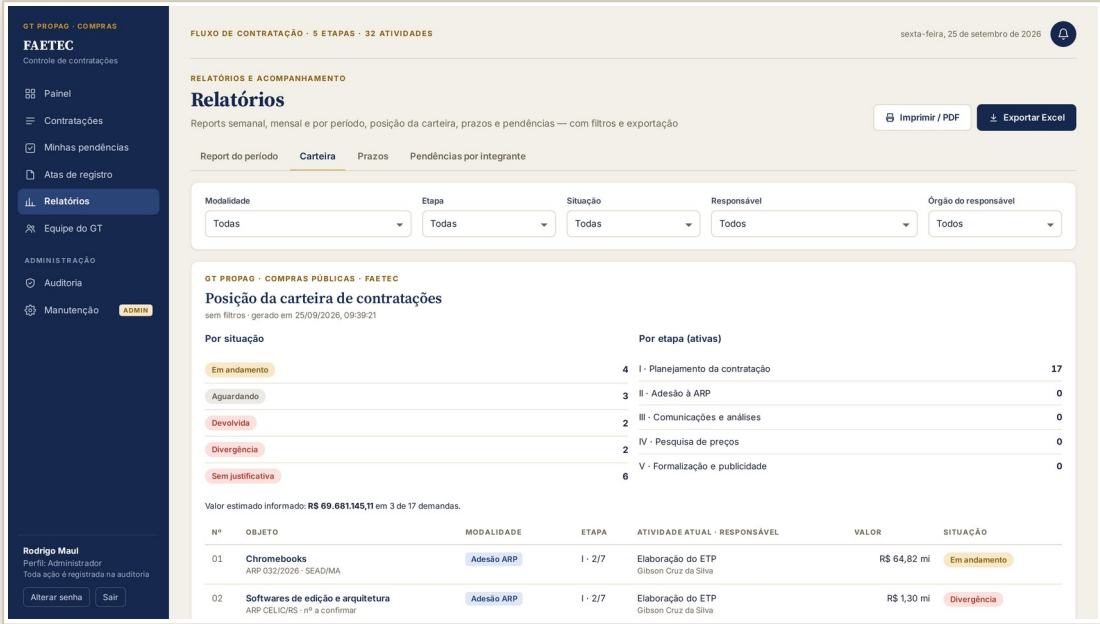

Relatórios · posição da carteira, com filtros e exportação para Excel e PDF

Depois de autorizada a 2ª carga, as mesmas telas passam a mostrar as 21 demandas — com o de-para da numeração registrado na auditoria.

Seis riscos a tratar antes de avançar

Risco	Onde (nº planilha)	Impacto	Ação
Carteira desatualizada no sistema	Toda a carteira	Painel mostra 17; planilha tem 20	Decidir e autorizar a 2ª carga
Firewall duplicado ou substituído	19 · sistema 12	Total 21 ou 22; marca sem justificativa	GT confirma e ajusta o objeto
Dupla contagem de computadores	08 × 09	Superdimensionar a compra	Conciliar quantitativos
Nº da ARP diverge (147 × 1477/2024)	02 · Softwares	Adesão na ata errada	Validar o nº com a CELIC/RS
Atas sem vigência (6 de 6 no sistema)	Catálogo de atas	Gate da Etapa II: carona em ata vencida	Registrar vigência e saldo
PCA/PEDTIC não confirmado	Toda a carteira	Item fora do PEDTIC exige revisão extraordinária	Ponto focal PCA confirma cada item

PRIORIDADES

Cinco demandas podem andar já

Demanda (nº planilha · sist.)	Valor	Onde está (24/09)	Próximo passo
01 • Chromebooks sist. 01 • Adesão • ARP 032/2026 SEAD/MA	R\$ 64,82 mi	Entregue pelo GT; em análise no Planejamento FAETEC desde 18/09	Cobrar retorno; confirmar PCA
10 • Appliances backup sist. 10 • Adesão • PE-RP 016/2024	R\$ 3,56 mi	ETP elaborado; TR em elaboração; TI de acordo	Concluir TR e mapa de riscos
03 • Telefonia VoIP sist. 03 • Participante • PE-RP 012/2024	—	Entregue; em análise no Planejamento desde 18/09	Cobrar retorno; confirmar PCA
06 • Licenças Microsoft sist. 07 • Participante • PERP 12/25	—	Aguarda publicação da ata; PRODERJ remaneja quantitativo	Acompanhar a ata
07 • Antivírus com EDR sist. 08 • Adesão • ARP 02/2026 TJMA	—	DOD elaborado; documentos em elaboração; TI pendente	Manifestação do TI (Gibson)

Mudança: o Antivírus entrou na lista (DOD elaborado) e os Softwares saíram — o processo retornou ao GT com observações. Juntas, as cinco somam 98% do valor informado.

Plano para os próximos 30 dias

1

Validar as 9 divergências da planilha e decidir o caso Firewall

Coordenação e conformidade · Semana 1

2

Autorizar a carga da 2ª planilha no sistema, com o de-para da numeração

Coordenação e administrador · após validação

3

Designar responsável geral e responsáveis por etapa nas 21 demandas

Coordenação · Semana 1

4

Cobrar o retorno do Planejamento FAETEC (01 e 03, desde 18/09) e das devolvidas (04 e 05)

Pontos focais (Frente III) · Semana 1

5

Obter as 6 justificativas pendentes (09, 11, 12, 14, 15, 18)

Coordenação e área demandante · Semanas 1-2

6

Confirmar PCA/PEDTIC e vigência das atas; estimar valor das 17 sem valor

Frentes II e III · Semanas 2-3

Indicadores para o próximo report

Indicador	Hoje	Meta em 30 dias
Carteira do sistema igual à planilha do GT	17 de 21	21 de 21
Demandas com responsável geral	0 de 17	21 de 21
Atividades abertas com responsável	1%	100%
Justificativas da área recebidas	14 de 20	20 de 20
Divergências da planilha resolvidas	0 de 9	9 de 9
Demandas além da Etapa I	0	ao menos 3

Depois da carga autorizada, todos os indicadores saem do sistema: Painel, Relatórios e Minhas pendências.
